



دولة فلسطين
بلدية نابلس
State of Palestine
Nablus Municipality

محطة التنقية الغربية
تقرير الاعمال الشهري



تشرين 2019



. يوسف ابو جفال

مسؤول التشغيل

. سامح البيطار

محاسب وسكرتير

. سليمان ابو غوش

مدير المحطة

. محمد حميدان

مهندس المعالجة ومسؤول



جدول المحتويات

4 (General overview) لمحة عامة	1
4 القراءات اليومية (Daily readings) لشهر تشرين ثاني	2
4 كمية المياه	2.1
6 التهويه لشهر تشرين	2.2
7 الفحوصات الكيميائية المُعدة في مختبر المحطة لشهر تشرين ثاني	3
12 (Operation of waste water line) تشغيل خط معالجة المياه	4
12(Stone trap)	4.1
12 (Screens &grease &grit removal) والدهون	4.2
13 (primary sedimentation tanks) الترسيب	4.3
13(Aeration tanks) التهوية	4.4
14 (Final sedimentation tanks) النهائي	4.5
14 (Operation of Sludge Line) تشغيل خط معالجة الحمأة	5
14 (Mechanical Sludge Thickening Unit) التشغيل التكتيف الميكانيكي	5.1
14(Primary Thickener) التكتيف	5.2
15 (Zebar Receiving Station) الزيتون المياه	5.3
15(Anaerobic Digester) الهاضم اللاهوائي	5.4
15 (Gas Holder)	5.5
17 (Gas Flare) شعله	5.6
17 (Sludge Drying Beds) تجفيف	5.7
17 (Sludge Storing) تخزين	5.8
17(Liquor Storage Tank)	5.9
18 الطاقة الكهربائية	6
19 (Desulfurization Unit) وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي	7
20 وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية (CHP)	8
21 (Photo Voltaic panels) الواح الطاقة الشمسية	9
22(Staff)طاقم العمل	10
24Summary	11
24Results Summary	11.1
25(Electrical Power Consumption) استهلاك الكهرباء	11.2
26(Average Lab Results)	11.3
27 (Preventive and remedial Maintenance) الصيانة الوقائية والعلاجية	12



4.....	24	اليومي	المياه	1 : يبين
5.....				2 : يبين
5.....		يوميا	كمية المياه	3 : يبين
6.....	1	التهوية	يوضح تركيز الأوكسجين	4 : يوضح تركيز الأوكسجين
6.....	2	التهوية	يوضح تركيز الأوكسجين	5 : يوضح تركيز الأوكسجين
7.....		العضوية (COD _{in})	تركيز	6 : يبين
7.....		المياه	تراكيز العضوية (COD _{out})	7 : يوضح
8.....		المياه المعالجه	BOD ₅ تركيز	8 : يظهر تركيز BOD ₅
8.....		عينة	(Total Suspended Solid)	9 : يبين تركيز (Total Suspended Solid)
9.....	5	للمياه	بين المتغيرين حيث يبين قيمه COD/BOD تقريبا	10 : يوضح
9.....	2019/11	2018/11	(pH) للمياه	11 : يوضح قيم
10.....	2019/11	2018/11	التهوية (MLSS) الحيوية	12 : يوضح قيم
10.....	2019/11	2018/11	المياه	13 : يوضح قيم الموصلية الكهربائية (Conductivity) للمياه
11.....	2019/11	2018/11	(TDS) الكلية	14 : يوضح قيم
11.....	2019/11	2018/11	النيتروجين	15 : يبين عملية النيتروجين
16.....	2019/11	2018/11	الحيوي يوميا	16 : يوضح الكميات المنتجة والكمية المستهلكة
16.....			CHP لشهر تشرين	17 : يوضح كمية الهاضم اللاهوائي
16.....			بينهما يتم استخدامه للبويلر	
18.....	2019/11	2018/11	المياه	18 : يوضح قيمة استهلاك الكهرباء وكمية المياه
18.....	2019/11	2018/11	COD	19 : يوضح كميات الكهربائية كيلو
19.....	2019/11	2018/11	مياه	20 : يوضح كميات الكهربائية كيلو
20.....			CHP الكهرباء	21 : الاستهلاك اليومي الكهربائية



(General overview)


1

شهر تشرين معالجه 317,716 استهلاك الكهرباء 248,942 يلو موزعة بين
(شركة الكهرباء باستهلاك 105,323 كيلو واط ساعة والخلايا الشمسية باستهلاك
10,520 كيلو واط) المخبرية للمياه المعالجة فعلى سبيل المثال كانت نسبة المواد الصلبة المعلقه
TSS في المياه المعالجة 20 /لتر بكفاءة معالجه 97% الأوكسجين الحيوي BOD₅ 16.5 /لتر بكفاءة معالجه
97%.

2 القراءات اليومية (Daily readings) لشهر تشرين


2.1 كمية المياه العادمة

كمية المياه العادمة تها محطة التنقية الغربية لشهر تشرين 317,716 حيث حسابها
. كما وتُظهر لنا الرسوم البيانية التالية كميات تدفق المياه العادمة ومعالجتها من خلال مخرجات برنامج السكادا .

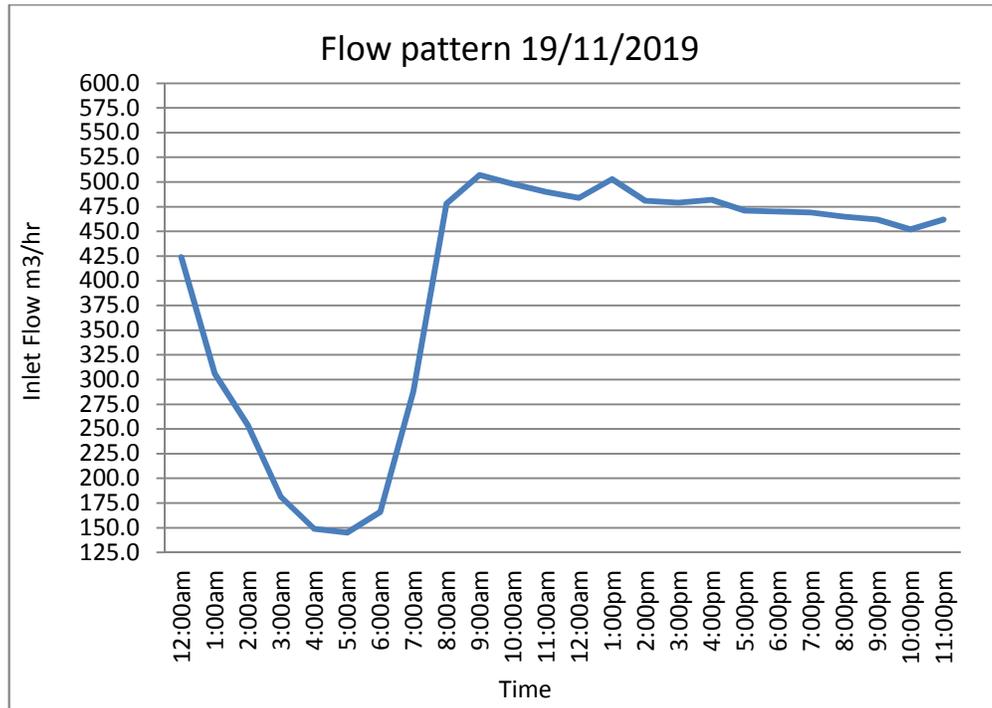


1 : يبين المياه العادمة اليومي 24



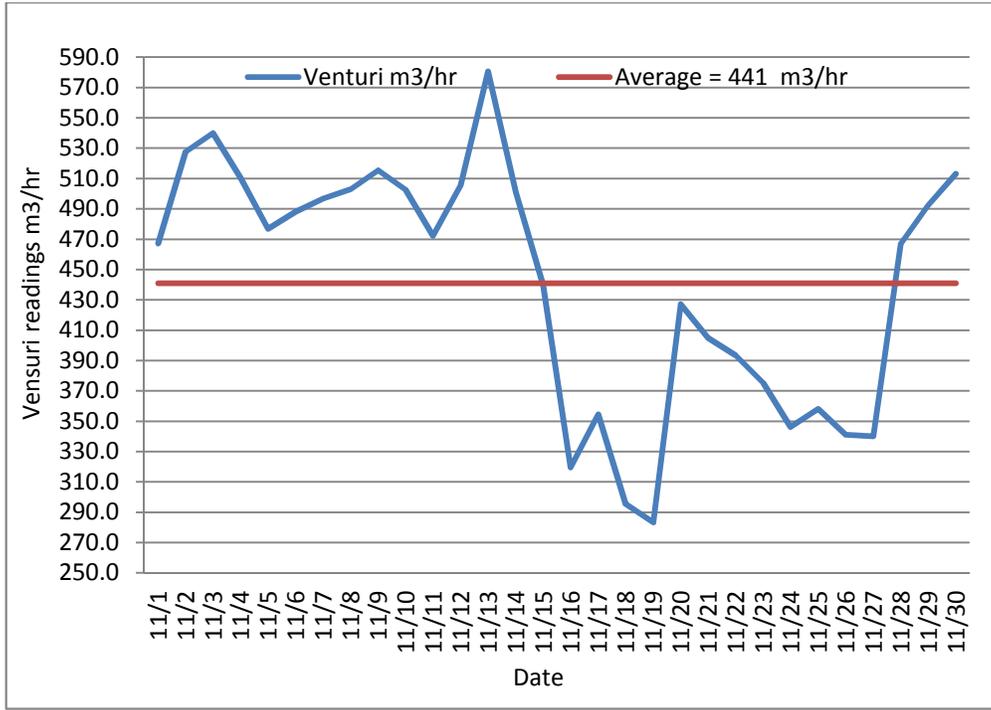


2 : بين

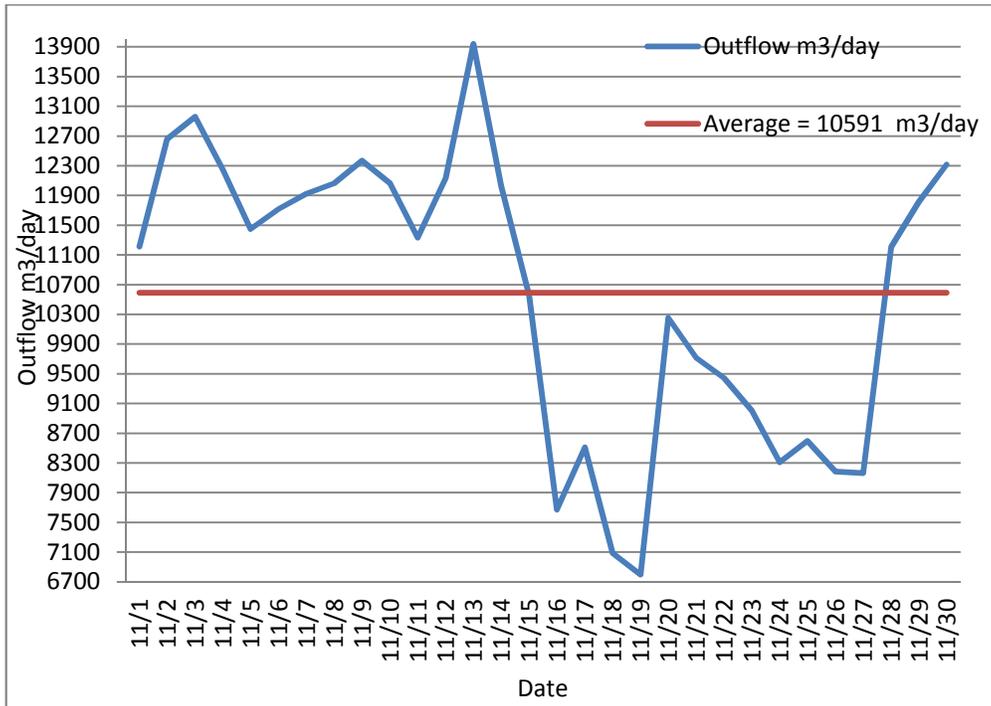


3 : بين كمية المياه المعالجة الخارجة يوميا من المحط .



2.2 تركيز الأوكسجين المذاب في خزان التهوية لشهر تشرين


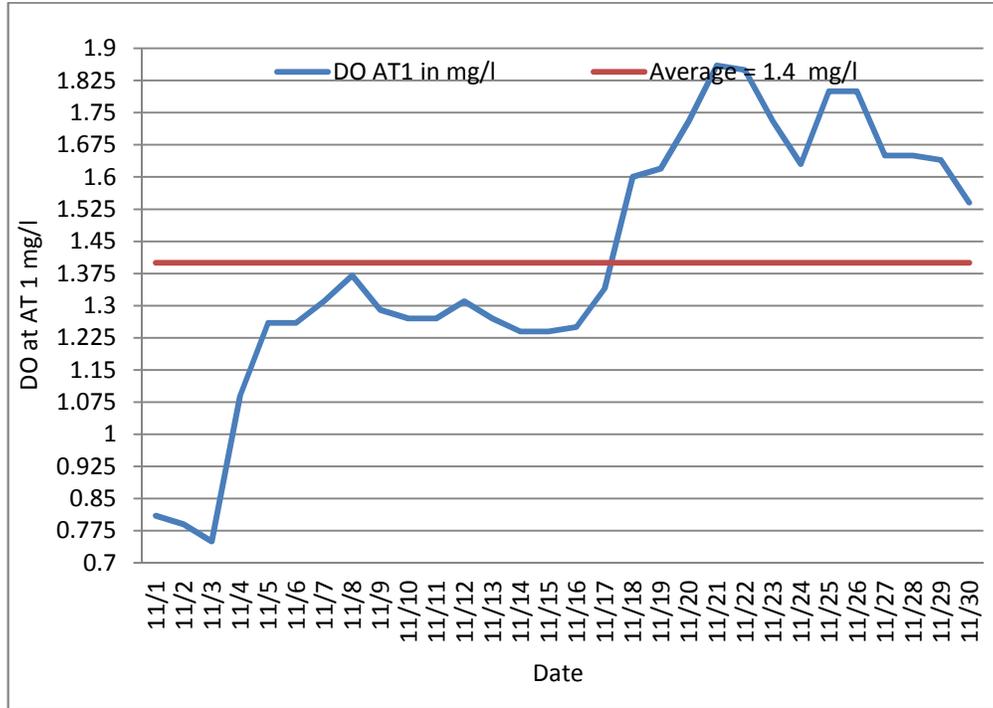



1 : يوضح تركيز الأوكسجين المذاب في خزان التهوية

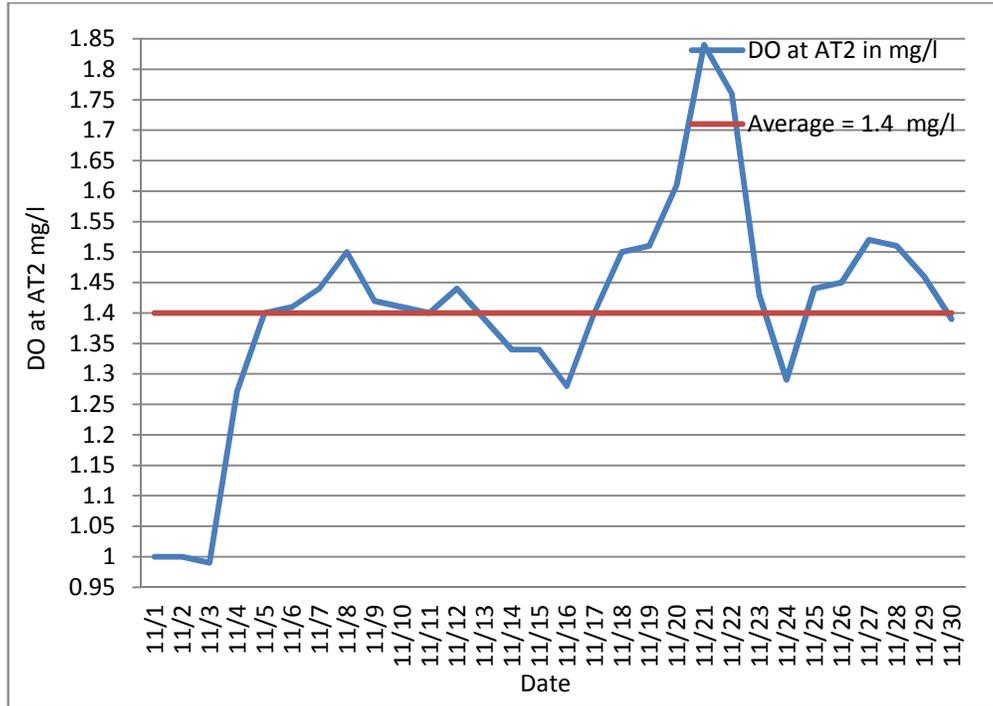


2 : يوضح تركيز الأوكسجين المذاب في خزان التهوية

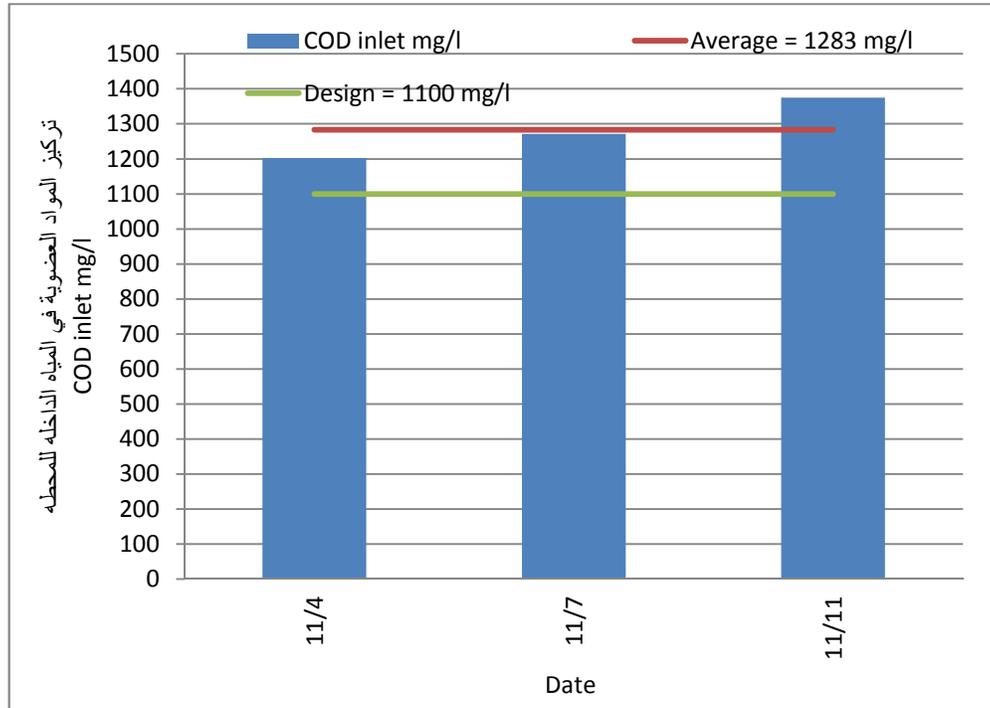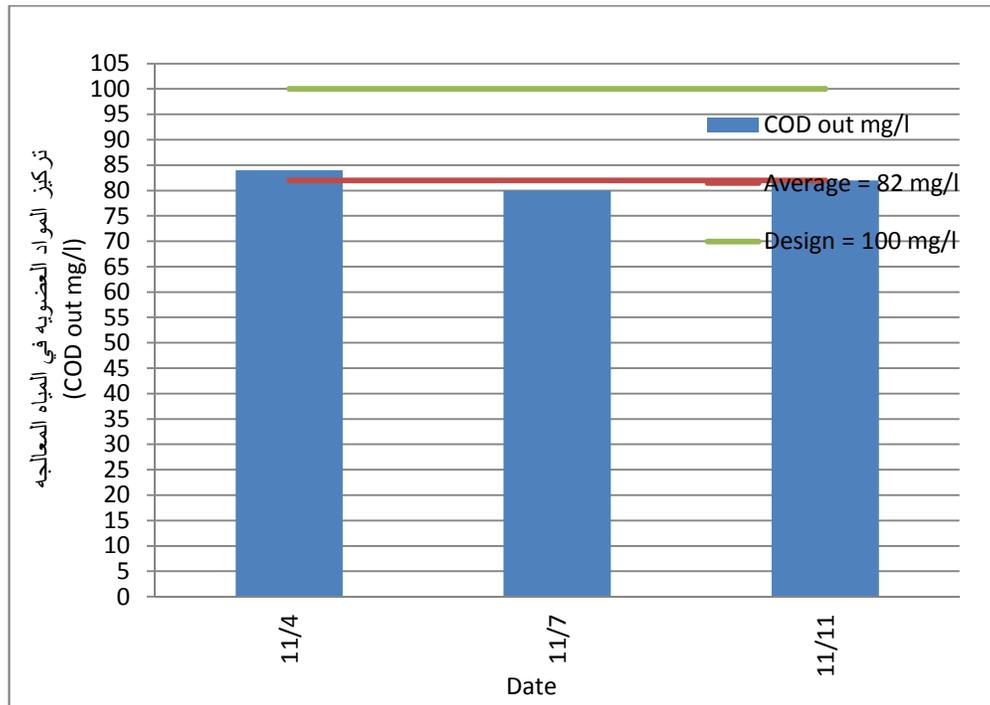

6 : يبين معدل نتائج فحص تركيز المواد العضوية (COD_{in})7 : يوضح كفاءة المعالجة من خلال تراكيز المواد العضوية في المياه الخارجة (COD_{out})

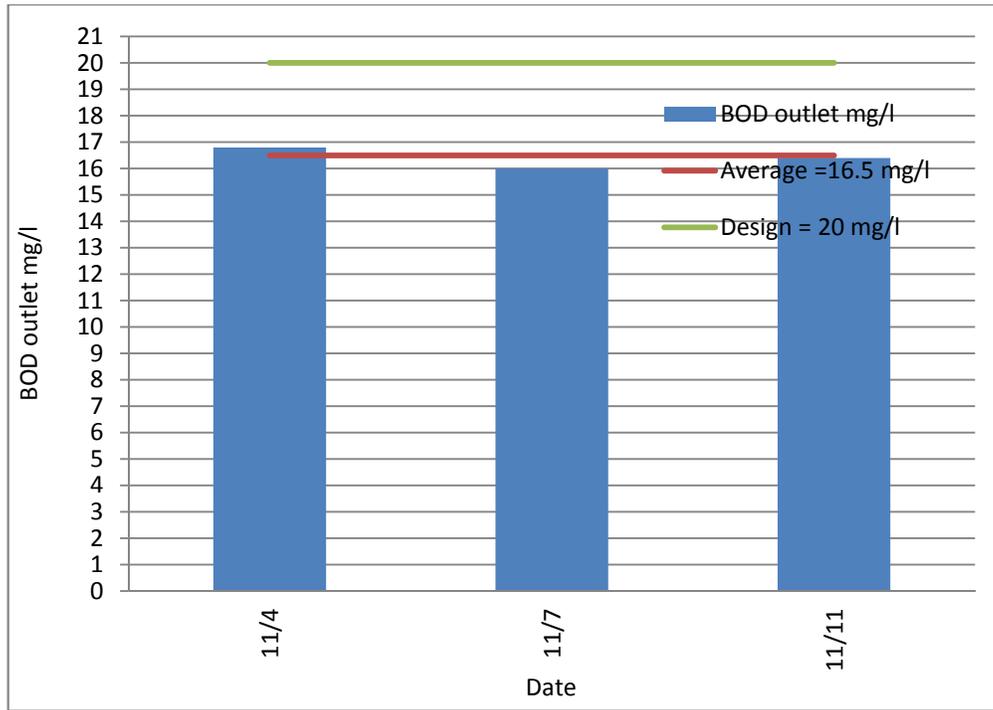


8 : يظهر تركيز BOD₅ في المياه المعالجه .

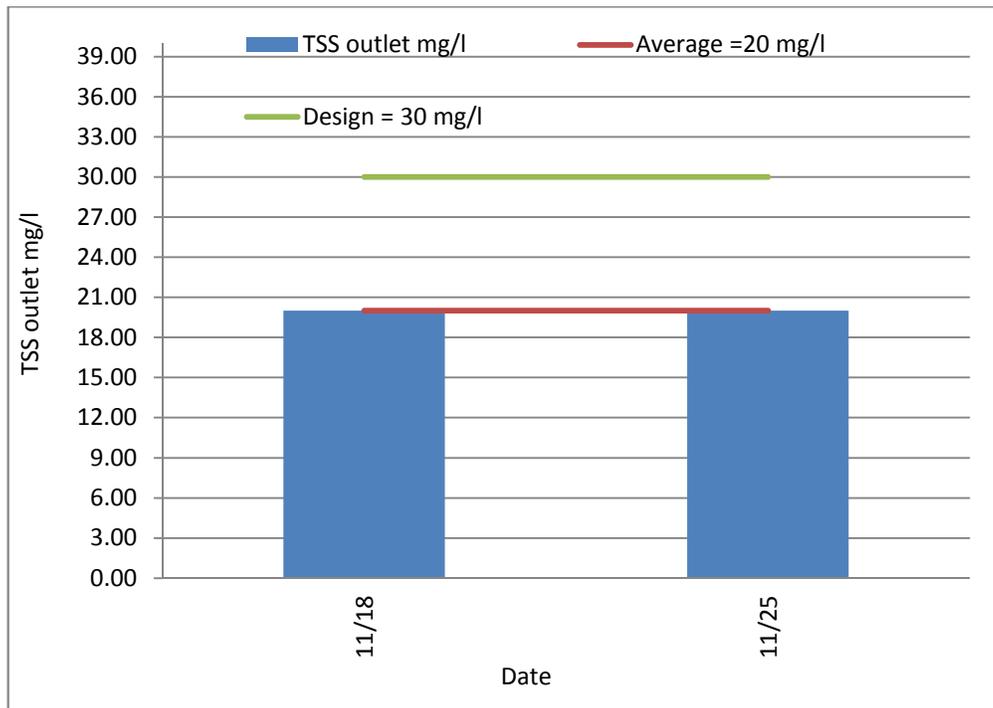


9 : يبين تركيز (Total Suspended Solid) في عينة المخرج.



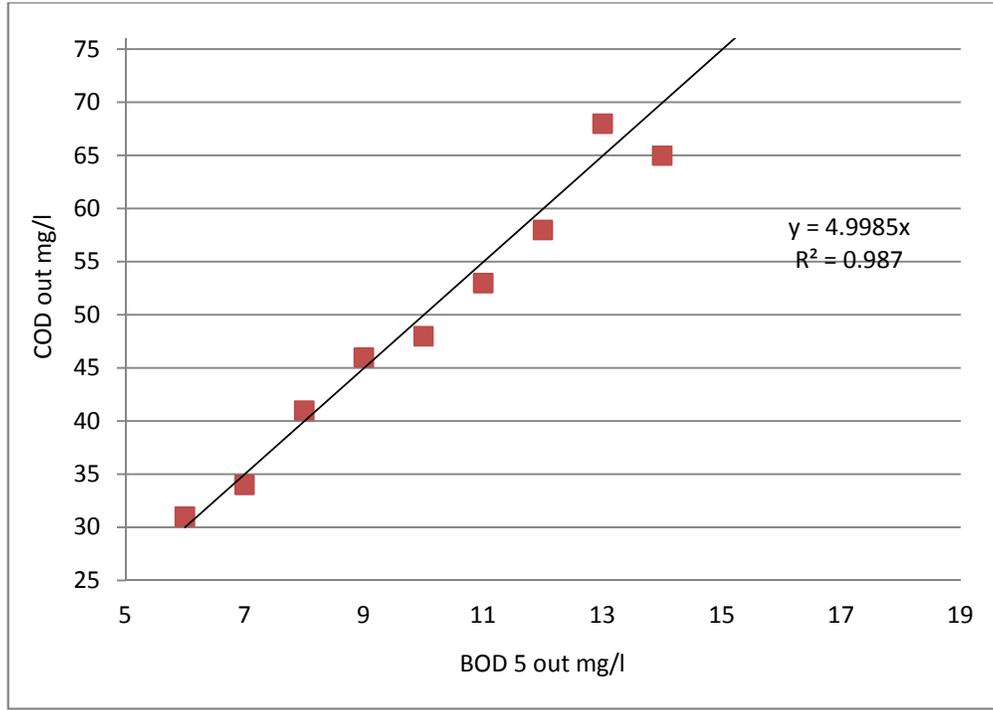


10: يوضح العلاقة بين متغيرين حيث يبين ان قيمه نسبة COD/BOD تقريبا تساوي 5 وذلك للمياه المعالجة.

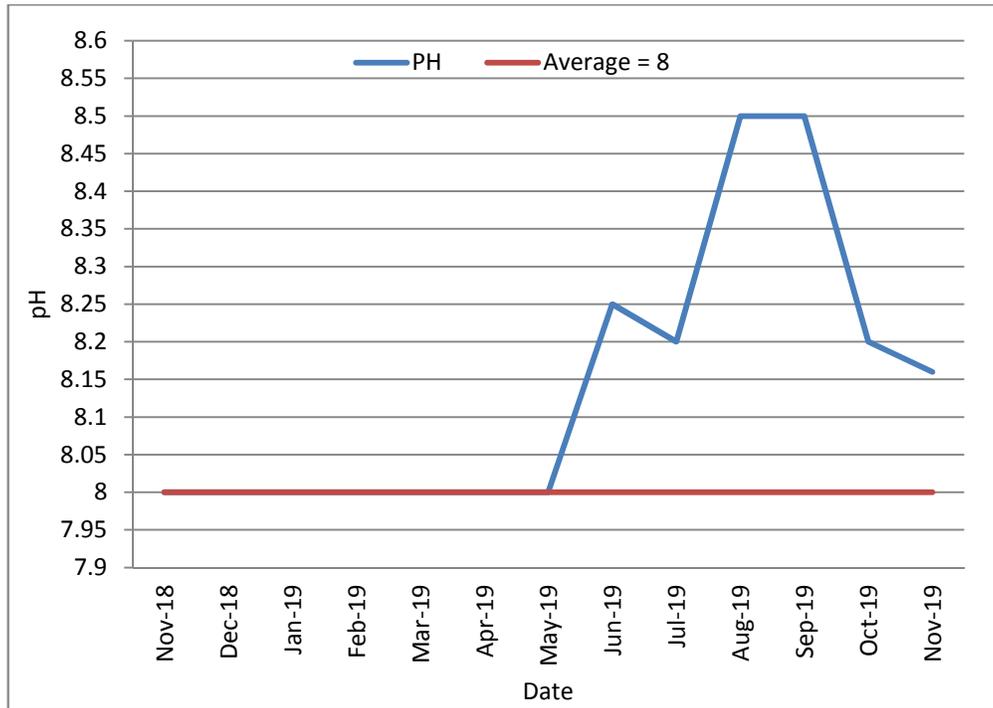


11: يوضح قيم درجة الحموضة للمياه الداخلة للمحطة (pH) 2019/11 2018/11



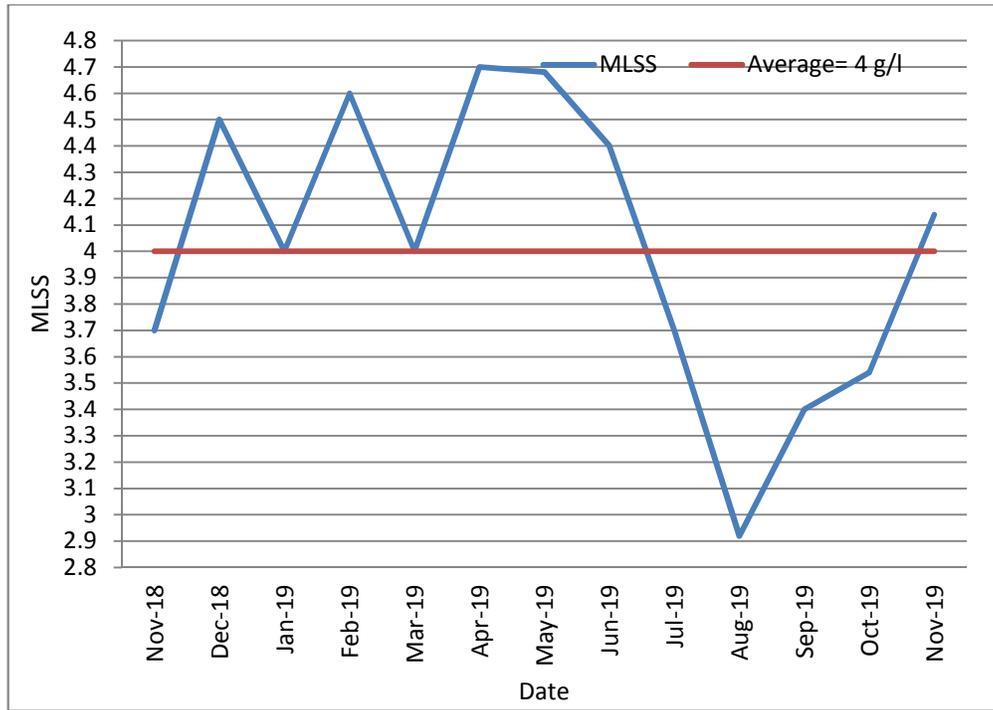


12: يوضح قيم نسبة المواد الصلبة المعقدة الحيوية في خزانات التهوية (MLSS) 2019/11 2018/11

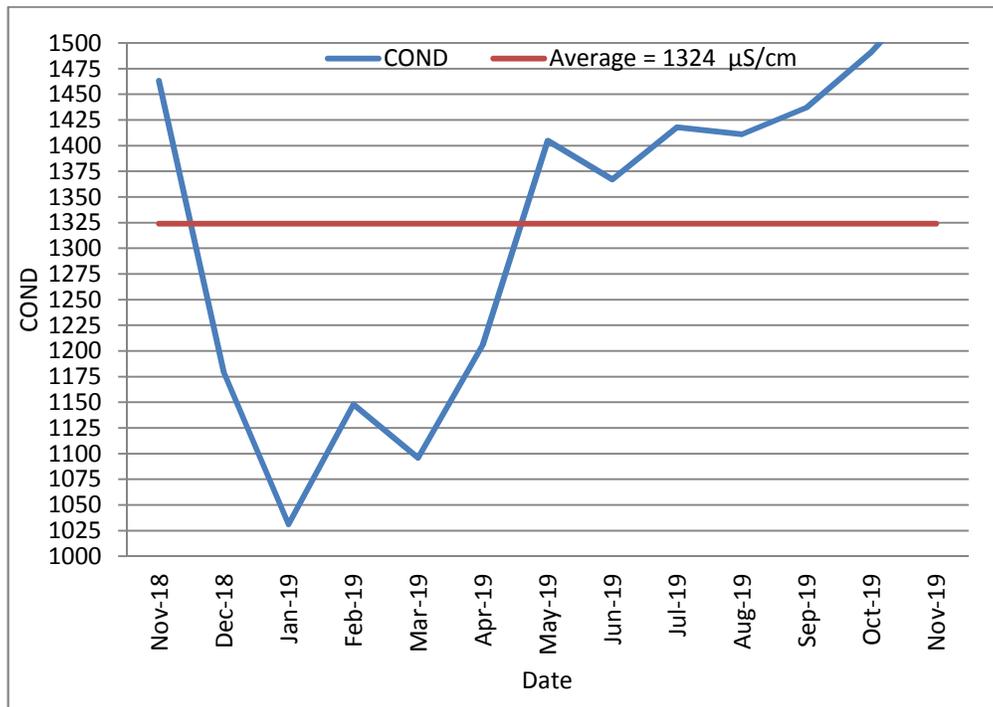


13 : يوضح قيم الموصلية الكهربائية للمياه العادمة الداخلة (Conductivity) 2019/11 2018/11



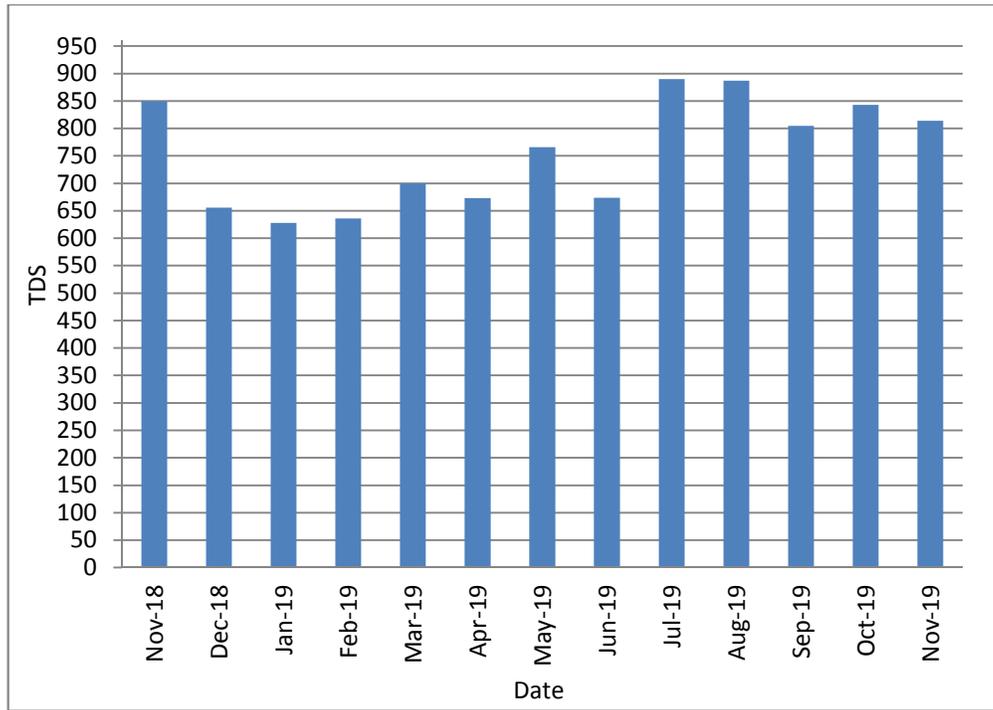

14: يوضح قيم نسبة الاملاح الكلية الذائبة في المياه المعالجة (TDS) 2019/11 2018/11

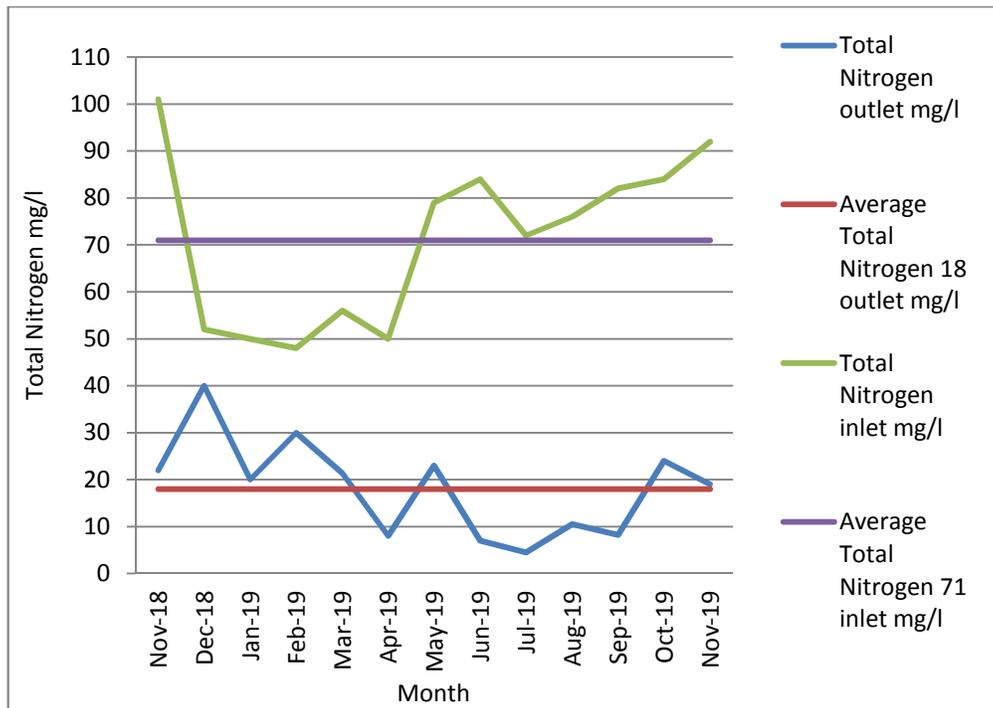

15: يبين فحوصات عملية إزالة النيتروجين 2019/11 2018/11



4 تشغيل خط معالجة المياه (Operation of waste water line)

4.1 (Stone trap)

حيث تم انشاء هذه الوحدة لحماية وحدة المصافي من الضرر نتيجة استقبال الحجارة والتمرسبات الثقيلة وخاصة خلال نزول الامطار وفي اوقات التدفقات العالية ، وتعمل الوحدة على اصطياد هذه الحجارة والتمرسبات الثقيلة في البداية عن طريق اصطياد الحجارة في حفرة خاص ذات ابعاد هندسية مجهزة بسلة يتم تفريغها وتنظيفها من وقت لآخر.

4.2 والدهون (Screens &grease &grit removal)

حيث تقوم المصافي () بالتقاط المخلفات الصلبة وشبه الصلبة والتي يزيد حجمها عن المسافة بين القضبان فمثلا بالمصافي (50mm) (5mm) وبالتالي حماية الوحدات اللاحقة من مضخات وخلاطات وأنابيب لتلف والاغلاقات مما يعيق سير عملية المعالجة ، اما عن وحدة ازالة الحصى والدهون فتقوم بترسيب المخلفات الغير عضوية والثقيلة نسبيا من (... وإرسالها الى خارج خط المياه وذلك ايضا لحماية الوحدات اللاحقة من التلغف والعطب ، وأيضا ل الدهون ان وجدت وإرسالها الى الهاضم اللاهوائي.



والدهون

4.3 وحدات الترسيب الاولي (primary sedimentation tanks)

في هذه الوحدة يتم ترسيب الحمأة الاولية والتي تحتوي على نسبة مواد صلبة 2.5% وارساله لاحقا الى وحدة التكتيف الاولي ، وبالتالي فان وحدات الترسيب الاولي تعمل على خفض المواد الصلبة الكلية ما نسبته 60% وايضا على خفض نسبة الاكسجين الحيوي الممتص 30%.

4.4 وحدات التهوية (Aeration tanks)

حيث يتم تهوية المياه الخارجة من وحدات الترسيب الاولي بعد خلطها مع الحمأة الراجعة وذلك لتزويد البكتيريا بالهواء اللازم للقيام بعمليات المعالجة الحيوية حيث يتكون في هذه المرحلة الحمأة المنشطة (MLSS) حيث يتم التحكم بعده بمتغيرات مهمة للحفاظ على مستوى مطلوب البكتيريا مع ضبط نسبة الاكسجين المذاب.



التهوية

4.5 وحدات الترسيب النهائي (Final sedimentation tanks)

يتم ترسيب الحمأة المنشطة داخل هذه الوحدات وأيضاً إنتاج مياه معالجة حيث يتم ارجاع النسيب الاكبر من هذه الحمأة الى وحدات التهوية كما ذكر سابقاً والجزء المتبقي من الحمأة يتم تكثيفها



يب النهائي

5 تشغيل خط معالجة الحمأة (Operation of Sludge Line)

5.1 تشغيل وحدة التكتيف الميكانيكي (Mechanical Sludge Thickening Unit)

يتم في وحدة تكتيف الحمأة المنشطة الزائدة مع البوليمر قبل عملية التغذية الى الهاضم اللاهوائي حيث تعمل على رفع نسبة المواد الصلبة من 1% إلى 6% من اجل زيادة كفاءة الهاضم اللاهوائي لانتاج الغاز الحيوي و تم تدريب فنيي التشغيل على كيفية تشغيل معدة التكتيف و كميات البوليمر التي يجب اضافتها وايضا على طريقه تغذية الهاضم وذلك تزامنا مع ضخ الحمأة الاولييه المعالجه في وحد التكتيف الاولي ليتم خلط المكونات معا وضخه الى الهاضم اللاهوائي .

5.2 دة التكتيف الأولي (Primary Thickener)

يتم تكتيف الحمأة الأوليه المرسله من خزانات الترسيب الأوليه وبالتالي رفع نسبة المواد الصلبة من 2.5% إلى 6% وضخ الحمأة المكثفه الى الهاضم اللاهوائي علما ان هذه العمليه تتم بشكل تلقائي باستخدام نظام SCADA حسب برنامج موضوع من قبل مشغلين محطة التنقيه

5.3 وحدة استقبال المياه العادمة من معاصر الزيتون (Zebar Receiving Station)

حيث يتم استقبال مادة الزيبار من معاصر الزيتون خلال موسم قطف الزيتون حيث يتم معالجتها في الهاضم اللاهوائي لتقليل الاثر البيئي الضار الناتج عن التخلص من مادة الزيبار بطرق غير صحية ويتم من خلال المعالجة زيادة كمية الغاز الحيوي المنتجة.


5.4 الهاضم اللاهوائي (Anaerobic Digester)

بدأت عملية تغذية الهاضم اللاهوائي خلال الأشهر السابقة وبشكل تدريجي باستخدام الحمأة الأولية المترسبه في حوض الترسيب الأولي والحمأة المنشطه الزائده حيث يتم مراقبة العمليه الحيويه واللاهوائيه يوميا من خلال عمل القياسات لدرجة الحرارة ودرجة الحموضه ونسبة غاز ثاني اكسيد الكربون الناتج من التفاعل الحيوي داخل الهاضم اللاهوائي وايضا اضافة مادة الجير الى محتويات الهاضم لأجل ضمان ثبات قيمة درجة الحموضة لتكون ما بين 6.8 و 7.2 .


حيث بدأ إنتاج الغاز الحيوي الناتج من عملية الهضم اللاهوائي الذي يحتوي على نسبة تقريبا 66% ميثان و 33% ثاني أكسيد الكربون. بناء على ذلك تم تدريب طاقم التشغيل على كيفية ضبط ومتابعة العمليه بأكملها وتوعيتهم بكل تفاصيل الوحدات المختلفه المرتبطه باننا وتخزينه.

5.5 (Gas Holder)

بإنتاج الغاز الحيوي من الهاضم اللاهوائي تم البدء بتعبئة خزان الغاز و ذلك بعد مروره بفلتر الحصى لتنتقيه من الشوائب و تم تدريب المشغلين على اجراءات العمل في خزان الغاز و توضيح عمل مكثفات الغاز و شعله الغاز و أجهزة القياس المختلفه للتحكم بكمية الغاز ويظهر لنا من خلال الرسم البيان التالي متوسط حجم الغاز المنتج لفترة عام كامل وكمية الانتاج والاستهلاك الشهرية.

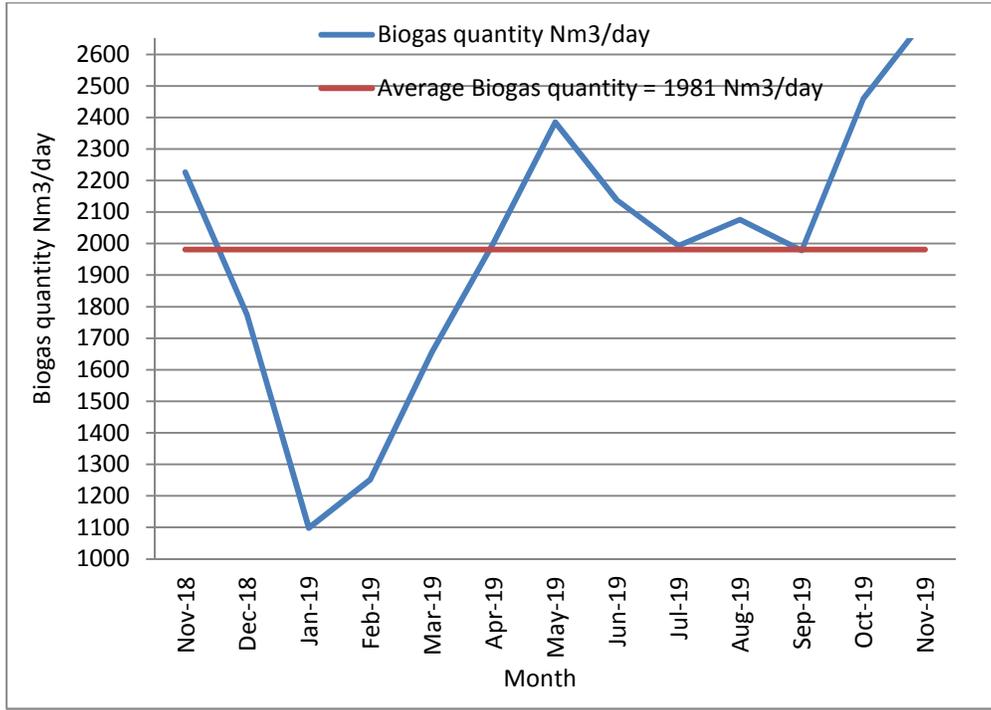

16: بوضوح الكميات المنتجة من الغاز الحيوي يومياً 2019/11 2018/11

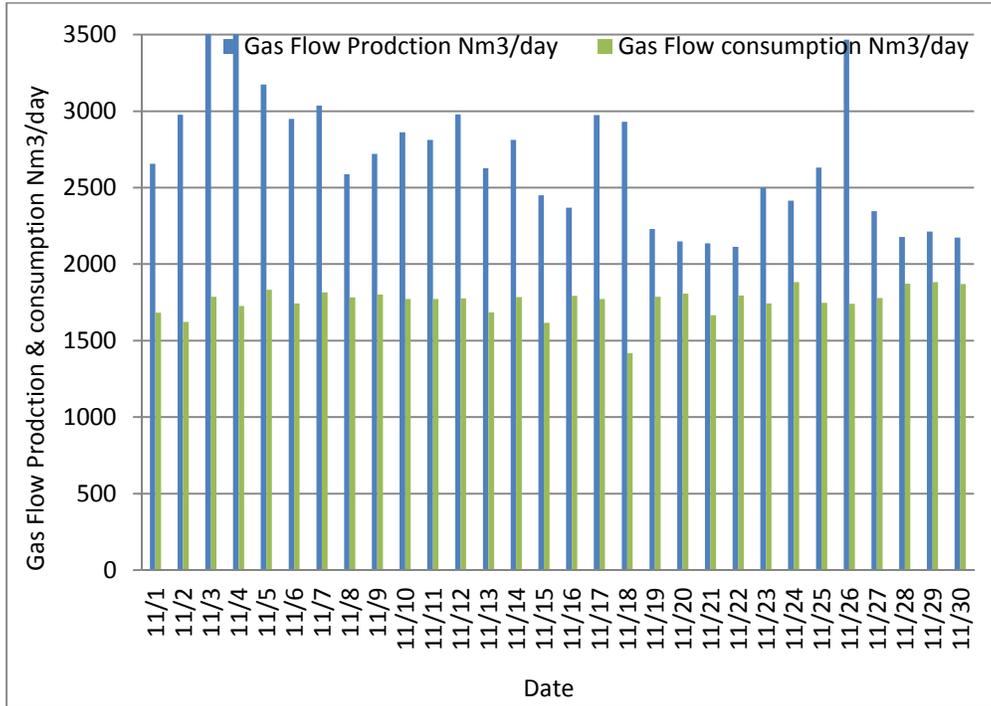

17: بوضوح كمية الغاز الناتج والكمية المستهلكة لـ CHP لشهر تشرين والفرق بينهما والذي يتم استخدامه للبوليلر درجة حرارة الهاضم اللاهوائي



5.6 شعله الغاز (Gas Flare)

عند امتلاء خزان الغاز الحيوي بنسبة 90% وذلك لتفريغ الغاز لدواعي السلامة العامة وتتوقف عند وصول النسبة الى 80% ويتم ذلك بواسطه نظام SCADA

5.7 احواض تجفيف الحمأة (Sludge Drying Beds)

يتم ضخ الحمأة المعالجة من خزان التكتيف الثانوي الى أحواض التجفيف وذلك للوصول الى المستوى من 40-50% .

5.8 تخزين الحمأة (Sludge Storing)

حيث يتم العمل على إدارة تخزين الحمأ وذلك بنقل الحمأة من أحواض التجفيف الى منطقة التخزين ويتم ذل

5.9 (Liquor Storage Tank)


حيث تمت اعاده النظر في ضخ العصارة الى احواض التهوية بطريقه تضمن عدم تأثر العمليه البيولوجيه سلبيا .




الحمأة الناتجة من وحدة عصر الحمأة




الهاضم اللاهوائي وشعلة الغاز

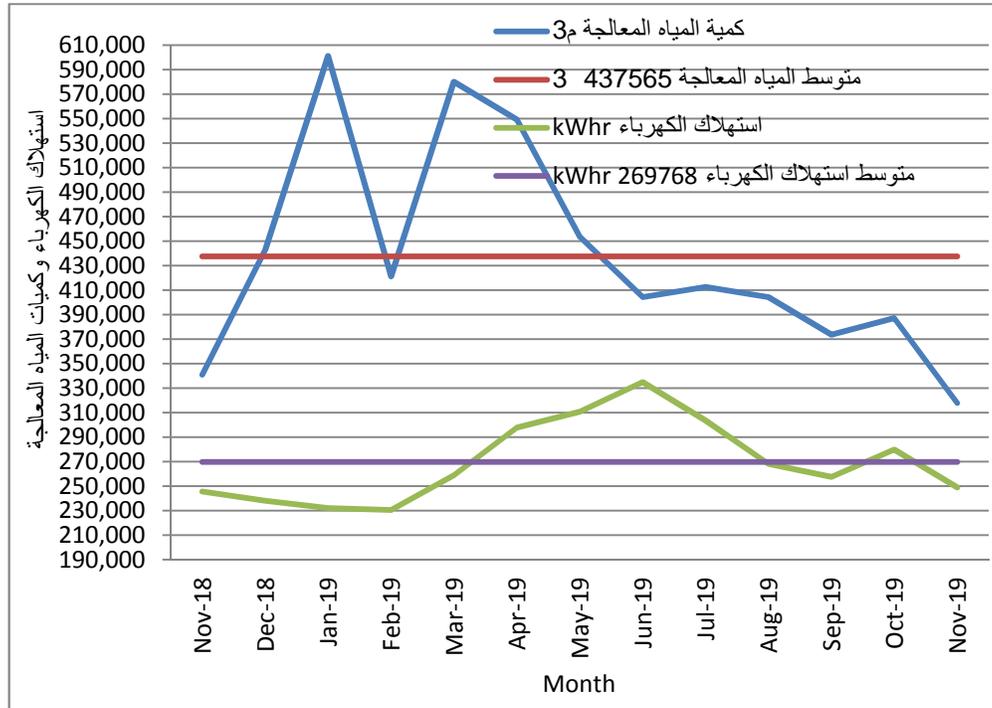

18: يوضح قيمة استهلاك الكهرباء وكمية المياه المعالجة 2019/11 2018/11

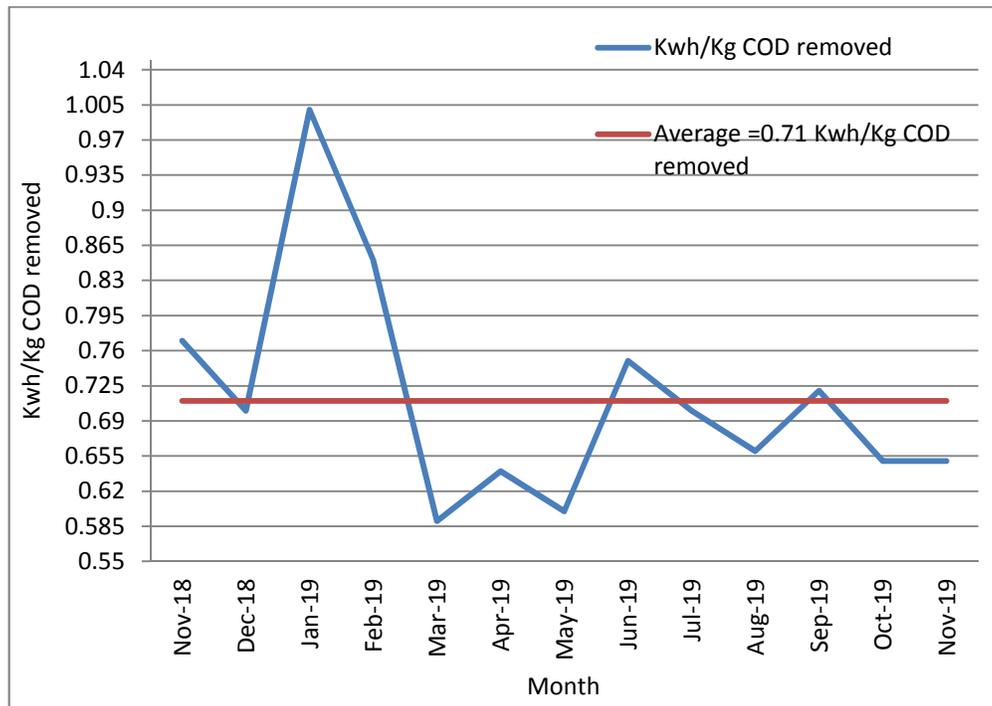

19: يوضح كميات الطاقة الكهربائية المستخدمة بدلالة كيلو واط ساعة لكل كغم COD 2019/11 2018/11

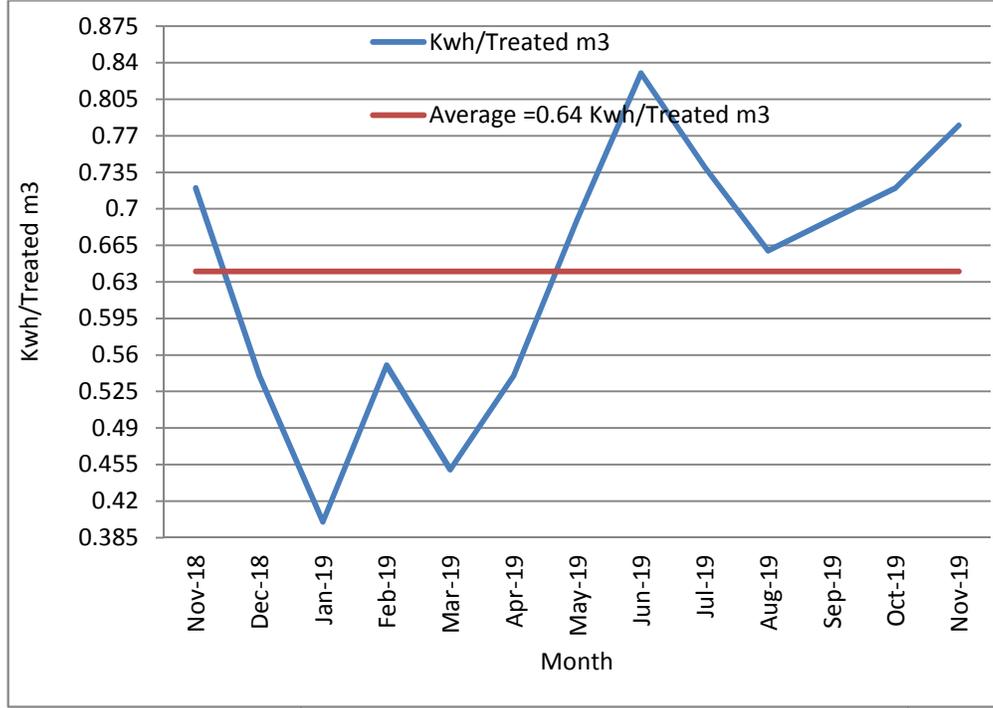

2019/11 2018/11 20: يوضح كميات الطاقة الكهربائية المستخدمة بدلالة كيلو واط ساعة لكل متر مكعب مياه معالجة

7 وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي (Desulfurization Unit)

تعتبر وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي احدى المكونات الرئيسية والأساسية لضمان سلامة واستمرارية وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية وذلك بمعالجة الغاز الحيوي المنتج من خلال ازالة غاز كبريتيد الهيدروجين (H_2S) ومادة السيلوكسين (Siloxane) باعتبار ان من الغازات الخطرة التي تسبب تآكل وتلف وحدة حرق الغاز.



وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي


8 وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية (CHP)

تعتبر وحدة توليد الطاقة الكهربائية من خلال حرق الغاز الحيوي احدى اهم استثمارات مخرجات محطة التنقية الغربية والتي تم تشغيلها بتاريخ 2017/6/18 حيث ستعمل على استغلال الغاز الحيوي المنتج وذلك بحرقه وتوليد طاقة كهربائية وحرارية ستصل حسب المتوقع مع ضمان استمرارية عملها ما يقارب 80%



وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية

الكهربائية للوحدة لشهر تشرين 133,099 ما نسبته 54% استهلاك الكلي للطاقة الكهربائية.

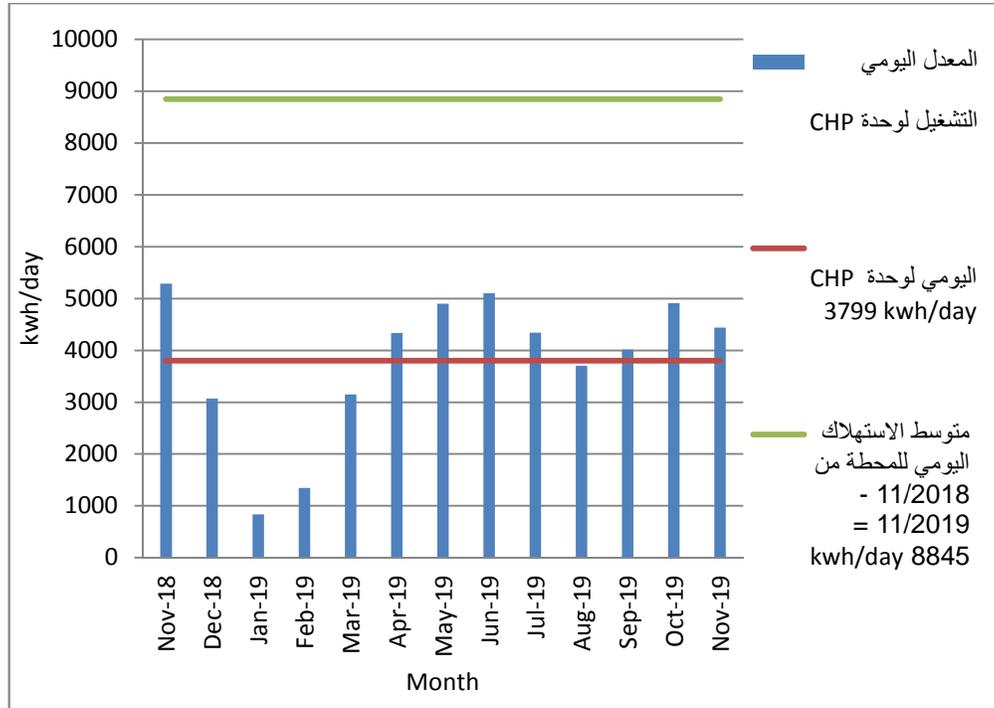

الاستهلاك اليومي للطاقة الكهربائية للمحطة مع انتاج الكهرباء من وحدة CHP

:21


9 الواح الطاقة الشمسية (Photo Voltaic panels)

تم بتاريخ 2018/5/1 تشغيل الالواح الشمسية 125 كيلو واط حيث تقوم هذه الالواح بالتقاط الطاقة الشمسية وتحويلها الى طاقة كهربائية يتم استخدامها في مضخات مشاريع اعادة الاستخدام للمياه المعالجة، مما يحقق توفير بحد اعلى 10% في ك الكهرباء للمحطة، وقد كان الانتاج لشهر تشرين اول 10,520 أي ما نسبته 4%.



يعمل المشروع عدد من المهندسين والفنيين المهرة وهم:

المسمى الوظيفي	
	. سليمان أبوغوش
مسؤول التشغيل	. يوسف ابو جفال
مهندس المعالجة والمختبر	. محمد حميدان
محاسب وسكرتير المحطة	سامح البيطار
فنية مختبر	
مهندس زراعي اعادة الاستخدام	يزن عودة
مهندسة مياه وبيئة	سجى يونس
فني تشغيل	أحمد جمال يعيش
فني تشغيل	عبد الهادي فاتح النوري
تشغيل	
فني تشغيل	
فني تشغيل	" " الهادي الشنتير
فني تشغيل	رامي مهدي حسيبا
فني كهرباء واطمئة ()	" " شنتير
	براء فخر الدين
	اسماعيل شحادة
	رامي عيد محمود عبد حسن
	زياد أحمد
	زيدان أحمد

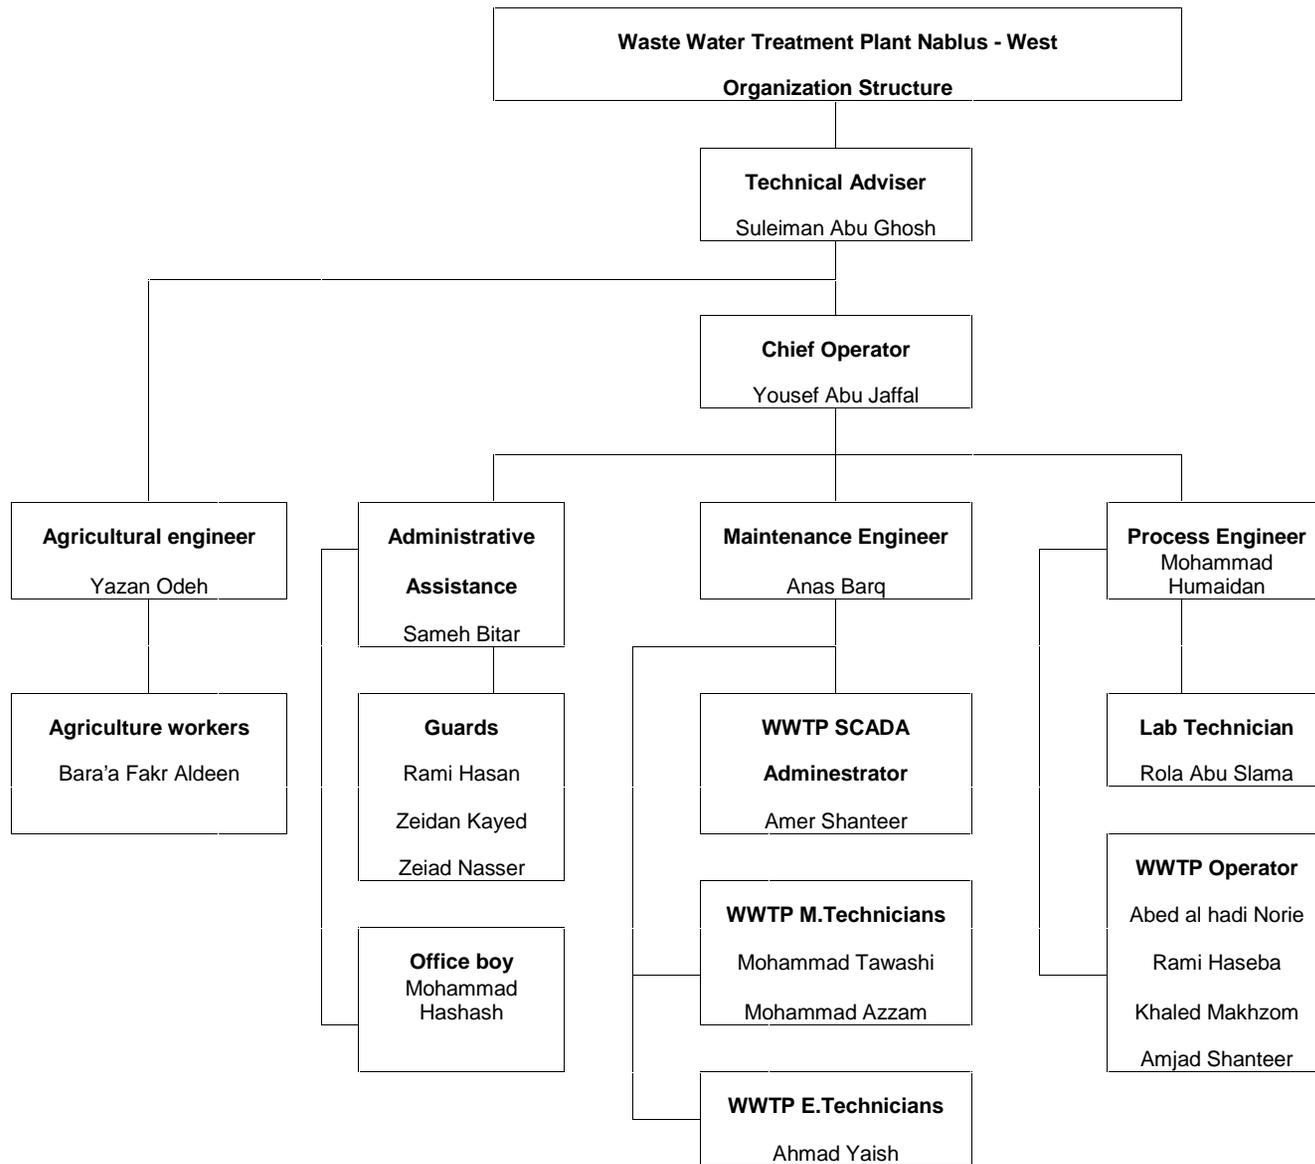

11 Summary

11.1 Results Summary

For period of 01/11/2019 to 30/11/2019, the results summary were as following:

Parameters	Design value 2020	Present value	Treatment %efficiency
Average incoming waste water m ³ /d	14000	10591	-----
Opening of Emergency gate to Wadi	-----	-----	-----
Inlet chemical oxygen demand COD _{in} mg/L	1100	1283	-----
Outlet chemical oxygen demand COD _{out} mg/L	100	82	94%
Outlet biochemical oxygen demand BOD ₅ mg/L	20	20	97%
Inlet Biochemical oxygen demand BOD ₅ mg/L	550	641	-----
Sludge age (day)	13.7	16.5	-----
MLSS g/L	3	4.14	-----
TSS _{inlet} mg/L	500	584	
TSS _{outlet} mg/L	30	20	97%
Electrical consumption /m ³ kW/m ³	0.85	0.78	-----
Electrical consumption/kgCOD _{removed} kW/kg	0.8	0.65	-----
Avg. out NH4-N mg/l	-----	7.8	-----
Avg. inlet NH4-N mg/l	-----	58.6	-----
Avg. out PO4-P mg/l	-----	5.45	-----
Avg. in PO4-P mg/l	-----	27.1	-----
Avg. out NO3-N mg/l	-----	12.5	-----
Avg. in NO3-N mg/l	-----	-----	-----
Avg. out TN mg/l	-----	19	-----



11.2 استهلاك الكهرباء (Electrical Power Consumption)

الجدول التالي يبين الاستهلاك الشهري للكهرباء مع كميات المياه المعالجه 2018/11 2019/11 مع ملاحظة انه قد تم تشغيل وحدة توليد الكهرباء الحرارية والحرارية بتاريخ 2017/6/18 وقد تم تشغيل الخلايا الشمسية بتاريخ 2018/5/1

الشهر	Avg	2018		2019										
		Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov
كمية المياه المعالجه m ³	437,565	340,846	443,095	601,232	421,126	580,084	549,103	453,242	404,234	412,602	404,171	373,627	387,262	317,716
استهلاك كهرباء الشمال kWhr	269,768	80,040	135,008	190,709	182,507	147,150	149,700	137,370	160,386	145,962	133,144	122,497	119,164	105,323
استهلاك الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية kWhr		6,900	7,757	15,482	10,523	14,143	18,000	21,500	21,361	23,130	20,190	14,511	13,417	10,520
استهلاك الطاقة المنتجة من وحدة توليد الطاقة kWhr		158,550	95,228	26,023	37,637	97,620	130,000	152,000	153,118	134,558	114,860	120,462	147,440	133,099
كيلو واط /	0.62	0.72	0.54	0.39	0.55	0.45	0.54	0.69	0.83	0.74	0.66	0.69	0.72	0.78



(Average Lab Results)

11.3

/ Test	Values	Average	2019											2018	
			Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan	Dec	Nov
COD out mg/l	Average	39.6	82.00	48.00	40.00	42.00	42.00	47.00	34.00	28.00	26.00	25.00	36.00	29.00	36.00
	Max	47.6	84.00	49.00	54.00	51.00	62.00	68.00	37.00	32.00	30.00	32.00	38.00	36.00	46.00
	Min	34.5	80.00	46.00	36.00	35.00	32.00	30.00	32.00	25.00	23.00	21.00	34.00	25.00	30.00
BOD out mg/l	Average	7.8	16.50	9.50	8.00	8.00	8.00	9.00	7.00	5.70	5.00	5.00	7.00	6.00	7.00
	Max	9.4	17.00	9.80	11.00	10.00	12.00	14.00	7.40	6.40	6.00	6.00	7.00	7.00	9.00
	Min	6.9	16.00	9.20	7.00	7.00	6.00	6.00	6.40	5.00	4.60	4.00	7.00	5.00	6.00
NH4-N out mg/l	Average	1.3	7.80	0.70	0.60	0.00	0.25	0.15	4.80	0.65	0.20	0.50	0.00	0.00	1.00
	Max	2.0	14.40	0.70	0.60	0.00	0.30	0.20	6.90	0.90	0.20	0.50	0.00	0.00	1.00
	Min	0.6	1.20	0.70	0.60	0.00	0.20	0.10	2.70	0.40	0.20	0.50	0.00	0.00	1.00
NO3-N out mg/l	Average	9.6	12.50	0.00	6.25	7.75	7.50	2.70	14.75	12.00	12.80	28.20	0.00	12.00	8.00
	Max	12.3	12.90	0.00	7.10	7.80	14.00	2.70	15.60	18.00	22.40	28.20	0.00	20.40	10.30
	Min	7.3	12.10	0.00	5.40	7.70	3.50	2.70	13.90	4.00	5.20	28.20	0.00	6.30	6.30
TN out mg/l	Average	17.9	19.00	24.00	8.25	10.50	4.50	7.00	23.00	8.00	14.50	30.00	20.00	41.50	22.00
	Max	22.2	19.00	24.00	8.50	11.00	5.00	10.00	27.00	8.00	24.00	30.00	20.00	78.00	24.00
	Min	13.2	19.00	24.00	8.00	10.00	4.00	4.00	18.00	8.00	2.00	30.00	20.00	5.00	19.00
PO4-P out mg/l	Average	4.1	5.45	3.41	3.58	2.00	1.76	4.60	4.90	8.40	9.10	3.30	0.00	3.18	3.30
	Max	4.1	5.45	3.41	3.58	2.00	1.76	4.60	4.90	8.40	9.10	3.60	0.00	3.18	3.80
	Min	4.0	5.45	3.41	3.58	2.00	1.76	4.60	4.90	8.40	9.10	3.00	0.00	3.18	2.80
TSS out mg/l	Average	9.2	20.00	9.00	17.00	8.00	12.00	16.00	10.00	3.00	3.00	5.00	2.00	6.00	9.00
	Max	16.8	20.00	10.00	36.00	16.00	42.00	32.00	14.00	3.00	5.00	6.00	2.00	12.00	20.00
	Min	4.7	20.00	8.00	8.00	4.00	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
MLSS mg/l	Average	4.0	4.14	3.54	3.40	2.92	3.70	4.40	4.68	4.70	4.00	4.60	4.00	4.50	3.70
	Max	4.7	4.71	4.26	3.90	3.36	4.50	5.00	5.35	5.30	4.00	5.40	5.00	5.20	4.50
	Min	3.4	3.40	3.11	2.80	2.55	3.00	3.60	4.19	4.00	4.00	3.80	3.00	3.70	2.70



12 الصيانة الوقائية والعلاجية (Preventive and remedial Maintenance)

صيانته الدورية لكافة وحدات محطة التنقيه حيث تكون موزعه على فترات

صيانته دوريه يومي و أسبوعي و شهري و ذلك حسب كتيب المصنع و ذلك لضمان ديمومة عمل المعدات الميكانيكيه و الكهربائيه .
سبيل المثال قياس مستوى الزيت وإضافته الى صندوق التروس (Gearbox) (E-bearing) الخاصه بمزودات الهواء
(Mammoth aerators) لتهدو و أيضا تفقد وحدات محطة ضخ الحمأة الاولية من ناحية قياس مستوى الزيت وايضا التشحيم
ولكل الاجزاء الميكانيكية المتحركة على اساس دوري كجزء من برنامج الصيانة الوقائية ،
الحيوية للغاز الحيوي ووحدة توليد الطاقة الكهربائيه والحرارية ضمن برنامج الصيانة الوقائية ، علما ان الامور التاليه تم صيانتها خلال شهر
تشرين 2019 :

الصيانة	الصيانة التي تمت
التشحيم الدوري	تم تشحيم ماكنات العصر والتكثيف وبوابات الراس وناقل الحمأة في وحدة العصر

