



دولة فلسطين
بلدية نابلس
State of Palestine
Nablus Municipality

محطة التنقية الغربية
تقرير الاعمال الشهري



حزيران 2022



. محمد حميدان
مهندس المعالجة ومسؤول

.
فنية المختبر

. يوسف ابو جفال

مسؤول التشغيل

. سامح البيطار

محاسب وسكرتير



المحتويات

3 لمحمة عامة (General overview)	1
3 القراءات اليومية (Daily readings) لشهر ايار	2
3 كمية المياه	2.1
5 التهوية لشهر ايار	2.2
6 الفحوصات الكيميائية المُعدة في مختبر المحطة لشهر ايار	3
11 تشغيل خط معالجة المياه (Operation of waste water line)	4
11 (Stone trap)	4.1
11 والدهون (Screens &grease &grit removal)	4.2
12 الترسيب (primary sedimentation tanks)	4.3
12 التهوية (Aeration tanks)	4.4
13 النهائي (Final sedimentation tanks)	4.5
13 تشغيل خط معالجة الحمأة (Operation of Sludge Line)	5
13 التشغيل التكتيف الميكانيكي (Mechanical Sludge Thickening Unit)	5.1
13 التكتيف (Primary Thickener)	5.2
14 المياه الزيتون (Zebar Receiving Station)	5.3
14 الهاضم اللاهوائي (Anaerobic Digester)	5.4
14 (Gas Holder)	5.5
15 شعله (Gas Flare)	5.6
15 تجفيف (Sludge Drying Beds)	5.7
15 تخزين (Sludge Storing)	5.8
16 (Liquor Storage Tank)	5.9
17 الطاقة الكهربائية	6
18 وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي (Desulfurization Unit)	7
19 وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية (CHP)	8
19 الواح الطاقة الشمسية (Photo Voltaic panels)	9
20 طاقم العمل (Staff)	10
22 Summary	11
22 Results Summary	11.1
23 استهلاك الكهرباء (Electrical Power Consumption)	11.2
24 (Average Lab Results)	11.3
25 الصيانة الوقائية والعلاجية (Preventive and remedial Maintenance)	12



(General overview)


1

شهر حزيران معالجه 434,007 استهلاك الكهربائيه 337,282 يلو موزعة بين ()
الكهرباء باستهلاك 236,649 كيلو واط ساعة ووحدة توليد الطاقة باستهلاك 73,819 كيلو واط ساعة والخلايا الشمسية باستهلاك
26,814 كيلو واط).

2 القراءات اليومية (Daily readings) لشهر حزيران


2.1 كمية المياه العادم

كمية المياه العادمة محطة التنقية الغربية لشهر حزيران 389,305 حيث حسابها
. كما وتُظهر لنا الرسم البياني كميات المياه

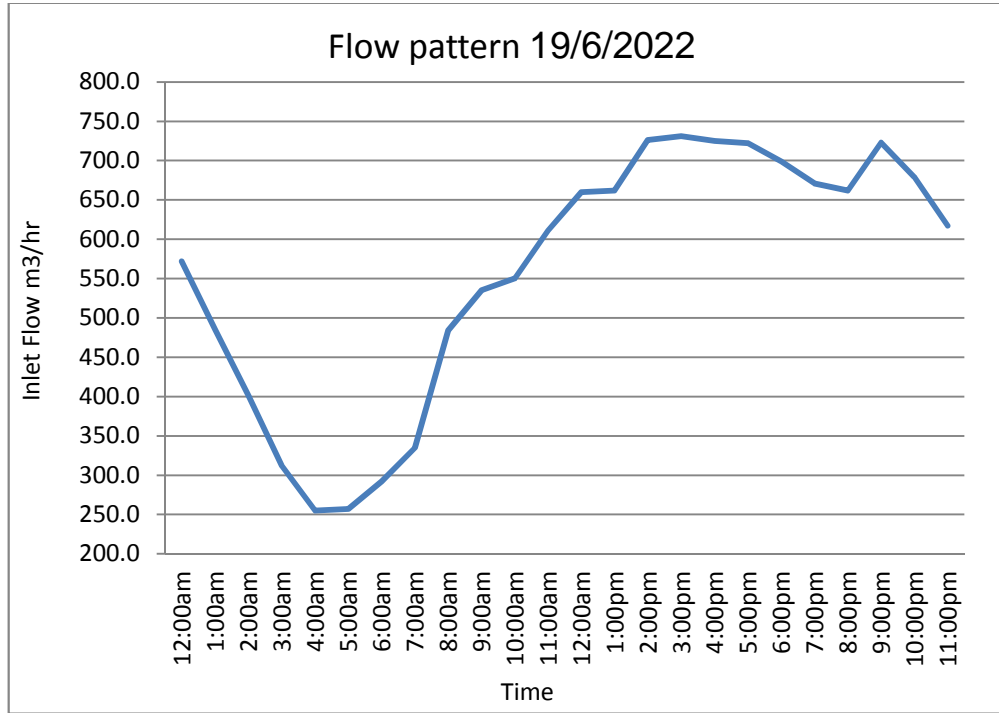


1 : يبين المياه العادمة خلال 24



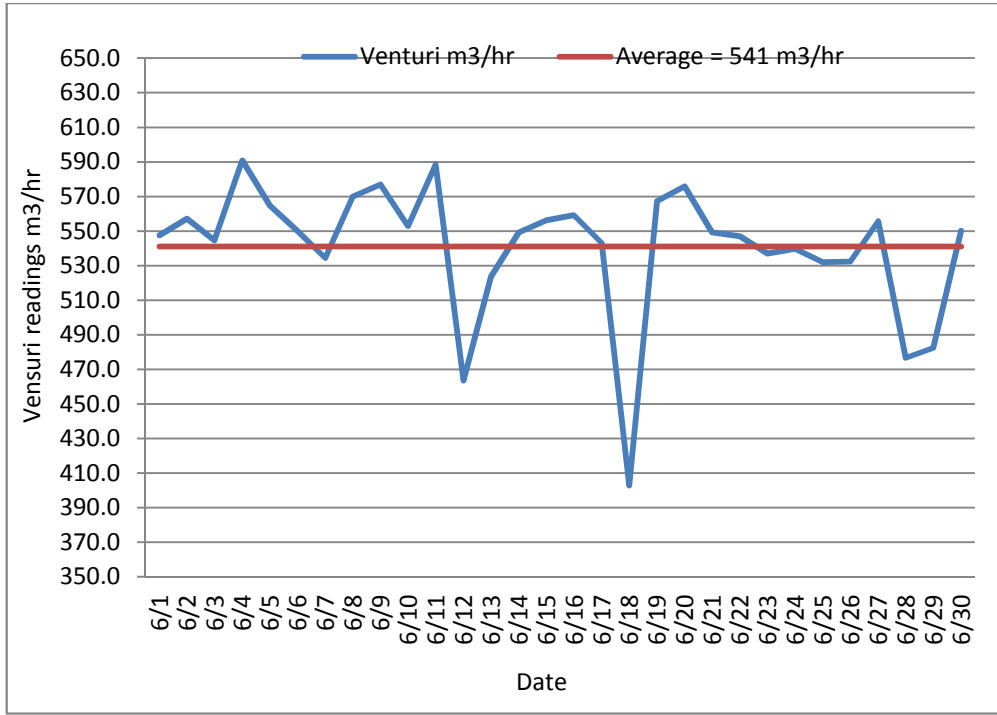


2 : يبين مياه الصرف الصحي اليومي باليوم.

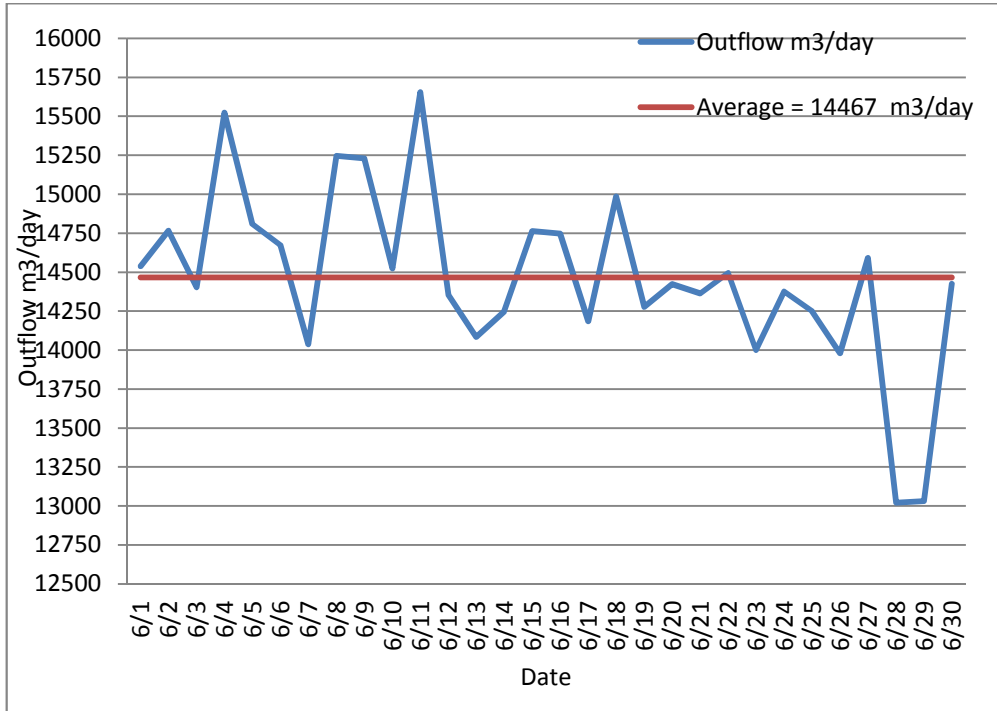


3 : يبين كمية المياه المعالجة الخارجة يوميا من المحط .



2.2 تركيز الأوكسجين المذاب في خزان التهوية لشهر حزيران

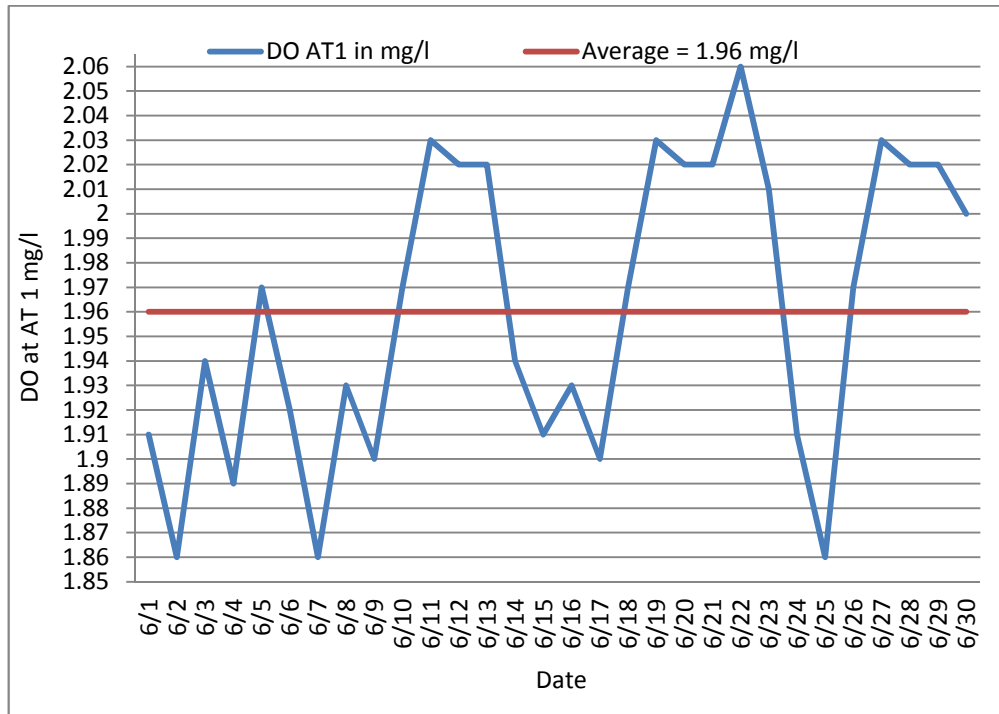


1 : يوضح تركيز الأوكسجين المذاب في خزان التهوية

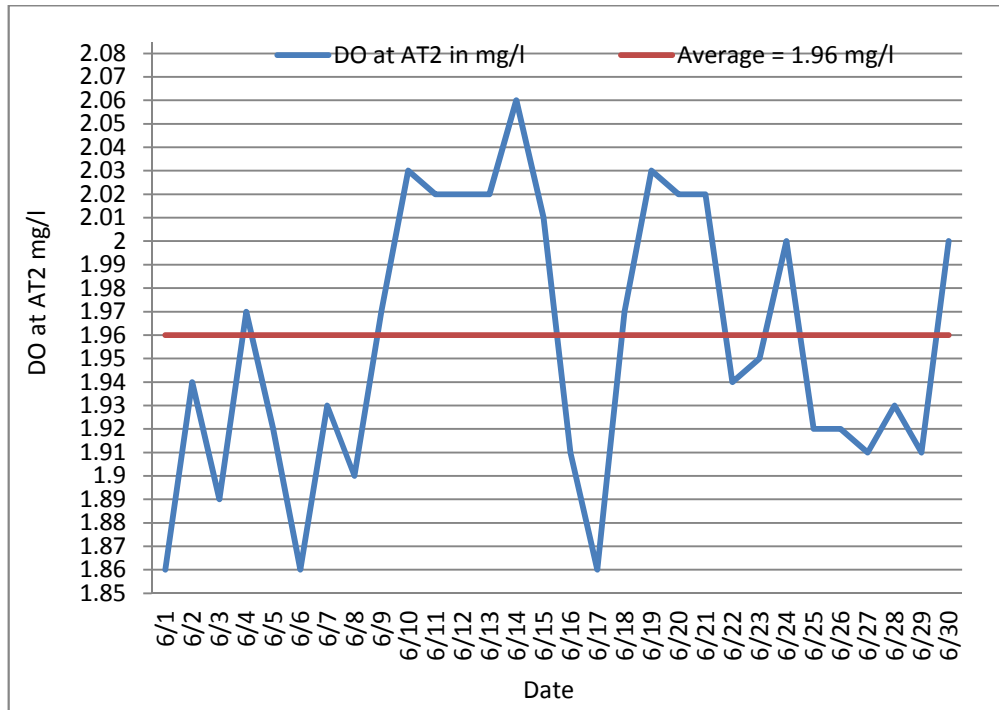


2 : يوضح تركيز الأوكسجين المذاب في خزان التهوية



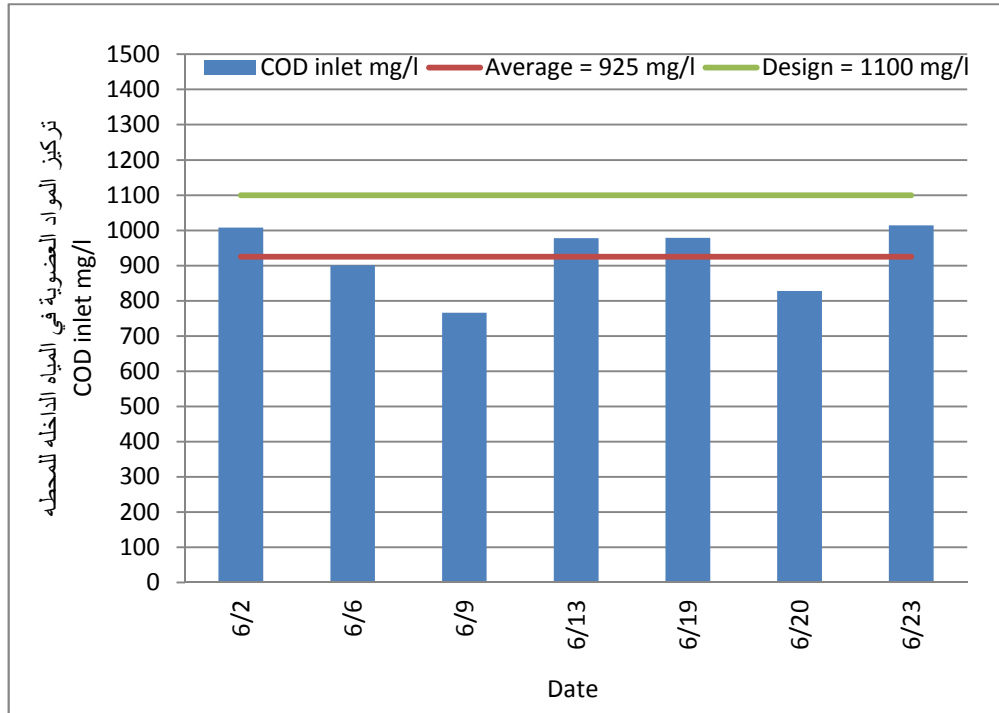


6 : يبين معدل نتائج فحص تركيز المواد العضوية (COD_{in})

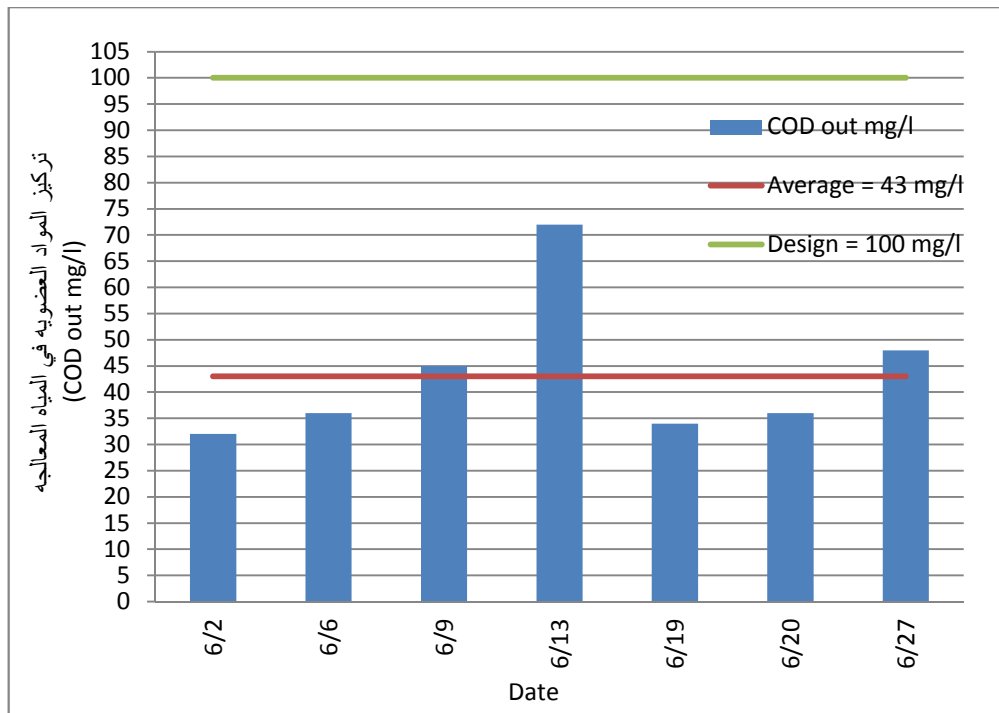


7 : يوضح كفاءة المعالجة من خلال تراكيز المواد العضوية في المياه الخارجة (COD_{out})



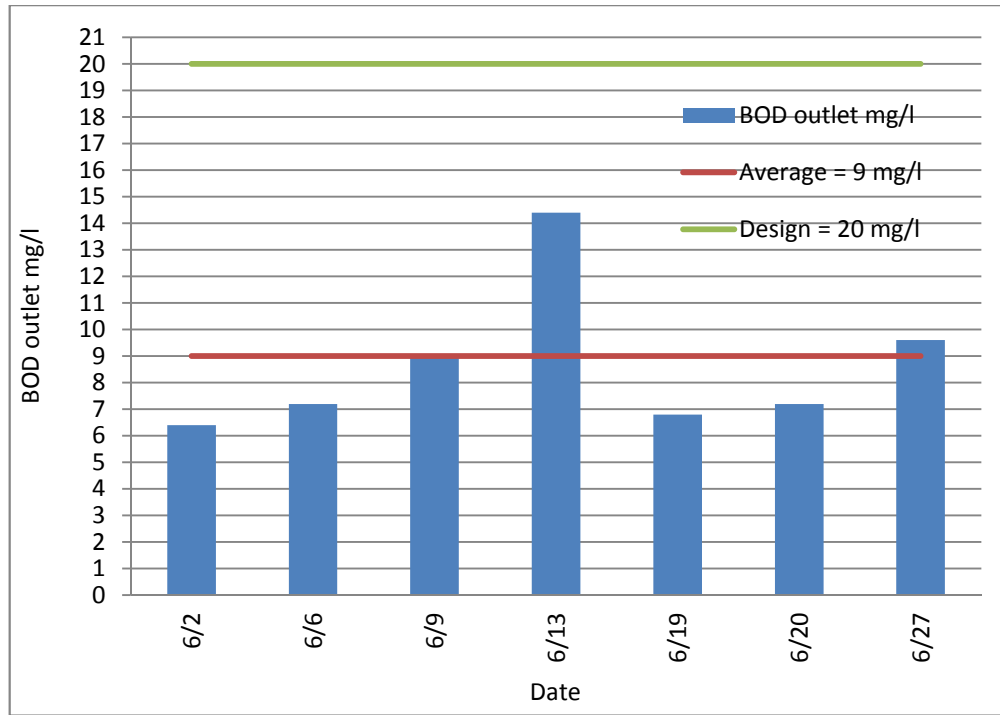


8 : يظهر تركيز BOD₅ في المياه المعالجه .

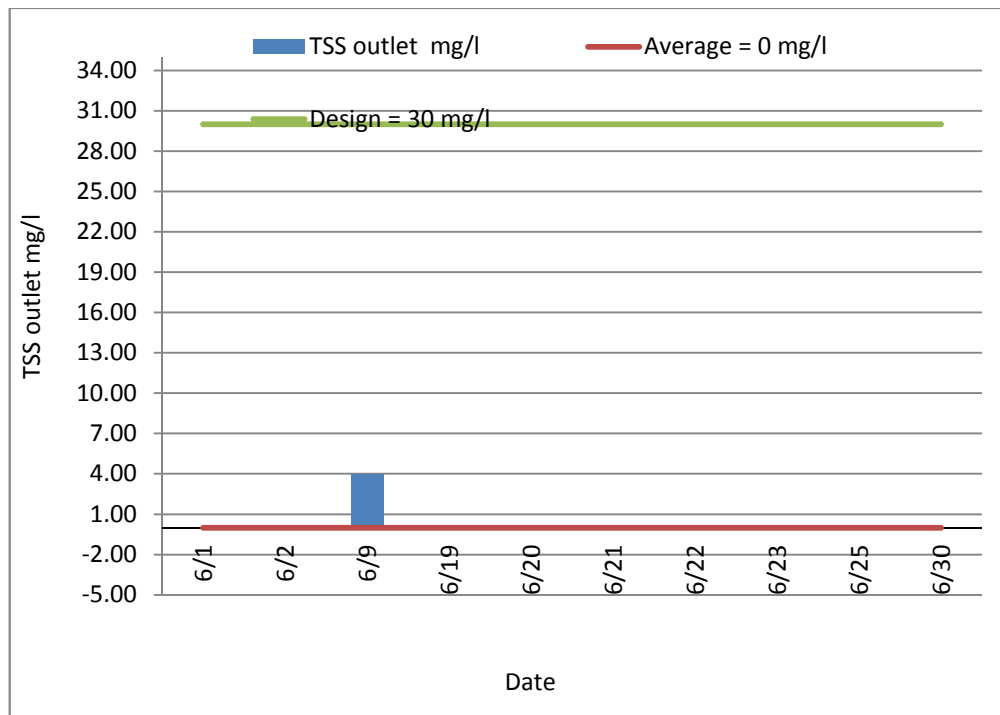


9 : يبين تركيز (Total Suspended Solid) في عينة المخرج.



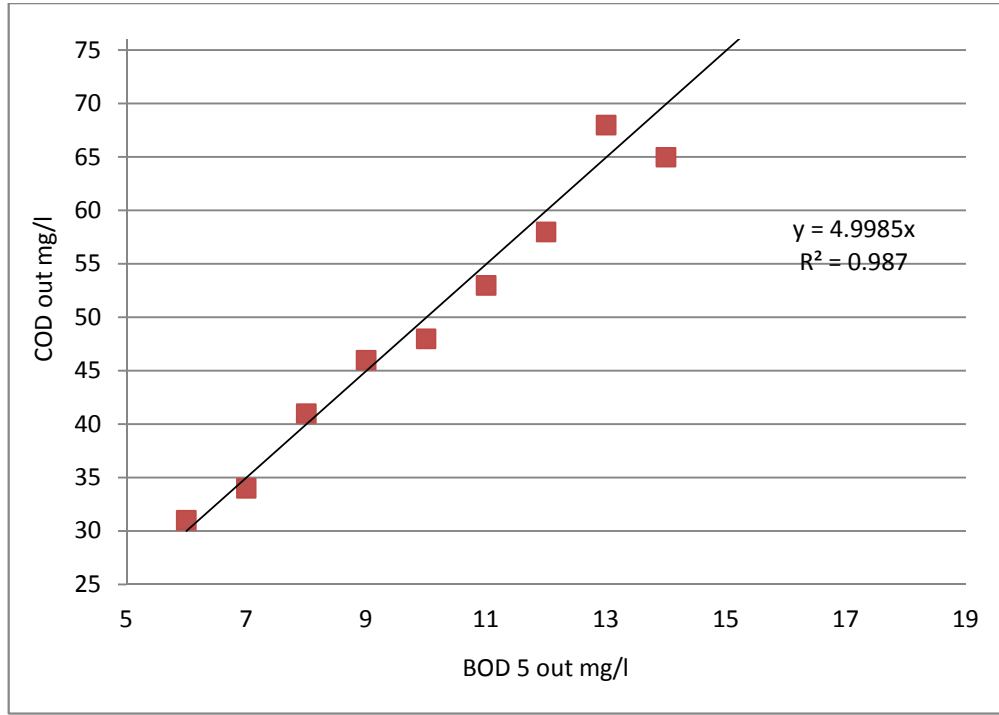


10: بوضوح بين متغيرين حيث يبين ان قيمه نسبة COD/BOD تقريبا تساوي 5 وذلك للمياه المعالجة.

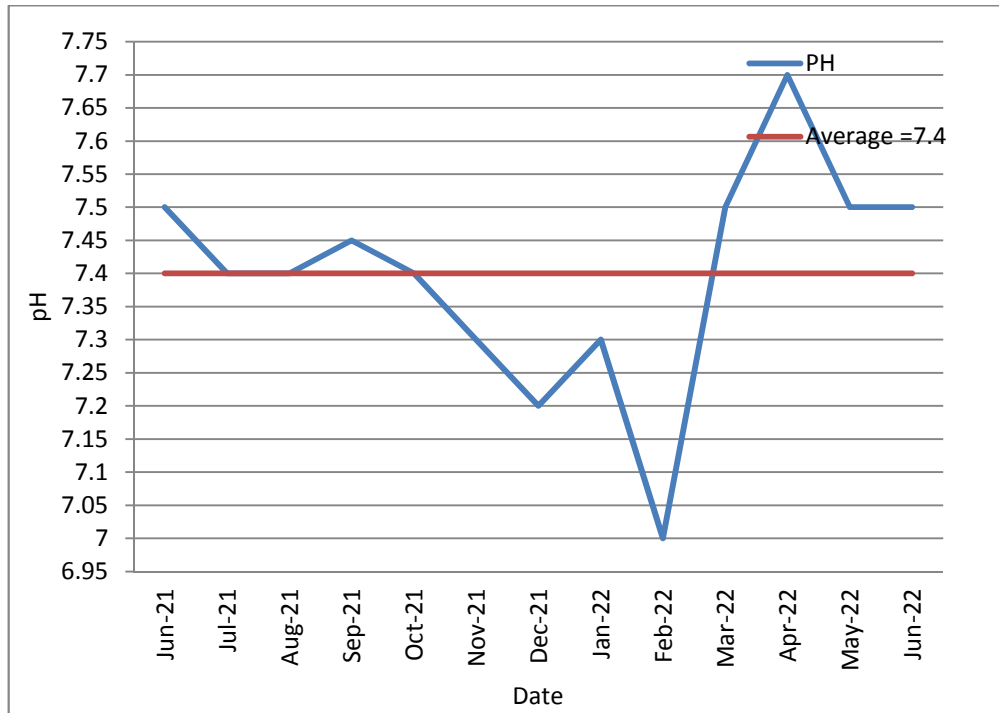


11: بوضوح قيم درجة الحموضة للمياه الداخلة للمحطة (pH) 2022/6 2021/6



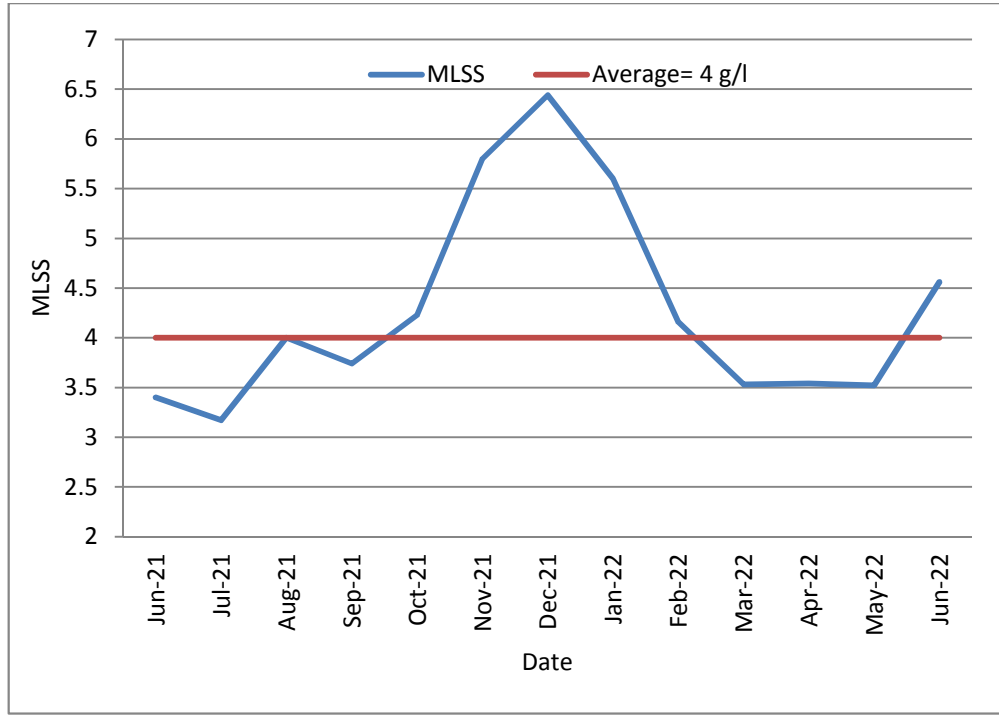


12: يوضح قيم نسبة المواد الصلبة المعلقة الحيوية في خزانات التهوية (MLSS) 2021/6 2022/6

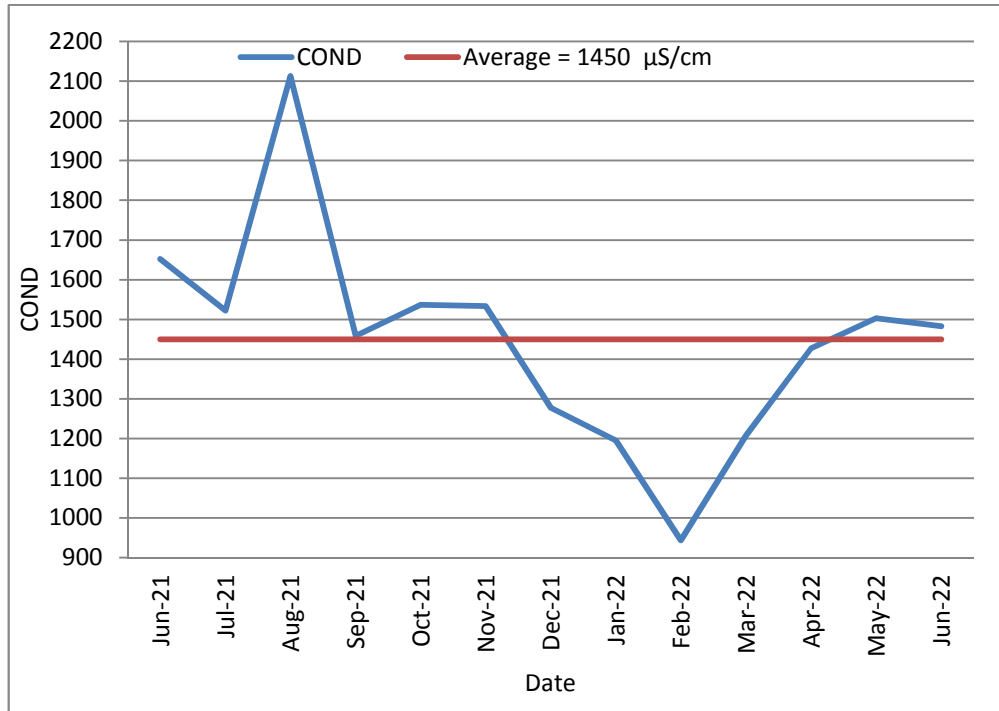


13 : يوضح قيم الموصلية الكهربائية (Conductivity) للمياه العادمة الداخلة 2021/6 2022/6



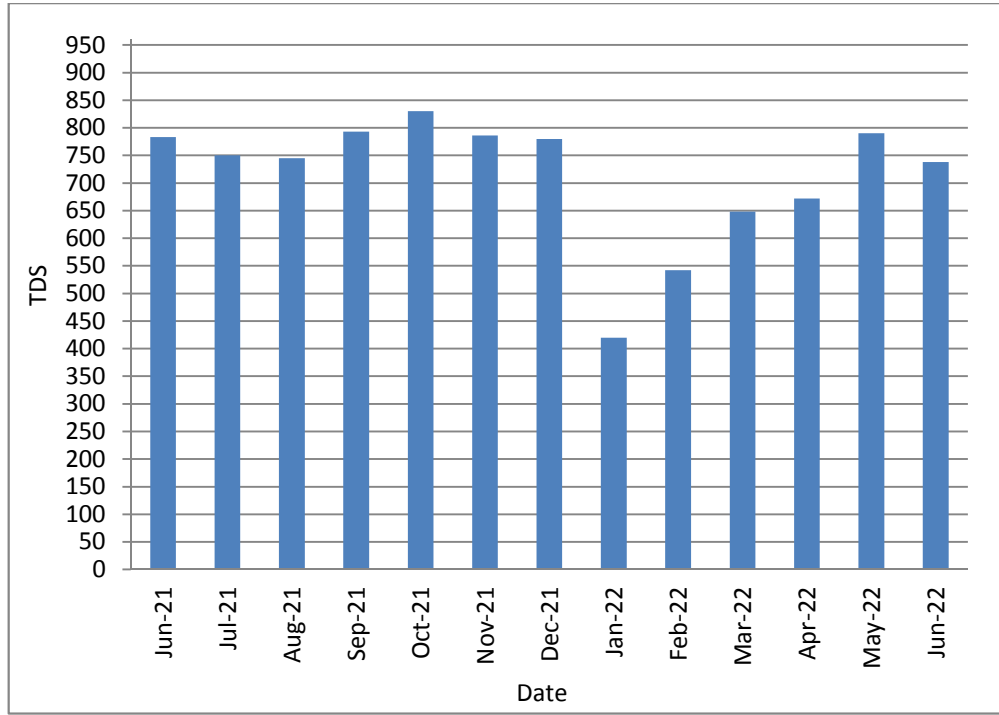

14: يوضح قيم نسبة الاملاح الكلية الذائبة في المياه المعالجة (TDS) 2022/6 2021/6

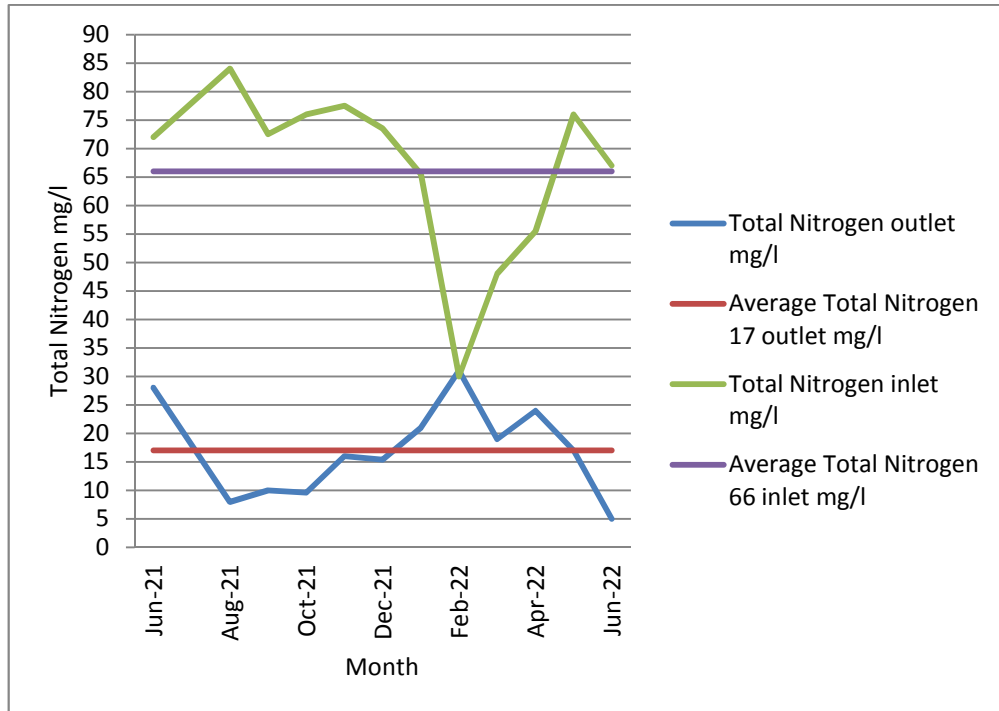

15: يبين فحوصات عملية إزالة النيتروجين 2022/6 2021/6



4 تشغيل خط معالجة المياه (Operation of waste water line)

4.1 (Stone trap)

حيث تم انشاء هذه الوحدة لحماية وحدة المصافي من الضرر نتيجة استقبال الحجارة الثقيلة وخاصة خلال نزول الامطار وفي اوقات التدفقات العالية ، وتعمل الوحدة على اصطياد هذه الحجارة ذات ابعاد هندسية مجهزة بسلة يتم تفريغها وتنظيفها من وقت لآخر.

4.2 لدهون (Screens &grease &grit removal)

حيث تقوم المصافي (بالتقاط المخلفات الصلبة وشبه الصلبة والتي يزيد حجمها عن المسافة بين القضبان فمثلا بالمصافي (50mm) وبتالي حماية الوحدات اللاحقة من مضخات وخلطات وأنابيب من التلف والاعلاقات مما يعيق سير عملية المعالجة ، اما عن وحدة ازالة الحصى والدهون فتقوم بترسيب المخلفات الغير عضوية والثقيلة نسبيا من (....) وإرسالها الى خارج خط المياه وذلك ايضا لحماية الهاضم اللاهوائي. وإرسالها ل الدهون أيضا وإرسالها



والدهون

4.3 وحدات الترسيب الاولي (primary sedimentation tanks)

في هذه الوحدة يتم ترسيب الحمأة الاولية والتي تحتوي على نسبة مواد صلبة 2.5% وارساله لاحقا الى وحدة التكتيف الاولي ، وحدات الترسيب الاولي تعمل على خفض المواد الصلبة الكلية ما نسبته 60% وايضا على خفض نسبة الاكسجين الحيوي الممتص 30%.

4.4 وحدات التهوية (Aeration tanks)

حيث يتم تهوية المياه الخارجة من وحدات الترسيب الاولي بعد خلطها مع الحمأة الراجعة وذلك لتزويد البكتيريا بالهواء اللازم للقيام بعمليات المعالجة الحيوية حيث يتكون في هذه المرحلة الحمأة المنشطة (MLSS) حيث يتم التحكم بعده بمتغيرات مهمة للحفاظ على مستوى مطلوب من البكتيريا مع ضبط نسبة الاكسجين المذاب.



التهوية

4.5 وحدات الترسيب النهائي (Final sedimentation tanks)

يتم ترسيب الحمأة المنشطة داخل هذه الوحدات وأيضاً إنتاج مياه معالجة حيث يتم ارجاع النسيب الاكبر من هذه الحمأة الى وحدات التهوية كما ذكر سابقاً والجزء المتبقي من الحمأة يتم تكثيفها



يب النهائي

5 تشغيل خط معالجة الحمأة (Operation of Sludge Line)

5.1 تشغيل وحدة التكتيف الميكانيكي (Mechanical Sludge Thickening Unit)

يتم في وحدة تكثيف الحمأة المنشطة الزائدة مع البوليمر قبل عملية التغذية الى الهاضم اللاهوائي حيث تعمل على رفع نسبة المواد الصلبة من 1% إلى 6% من اجل زيادة كفاءة الهاضم اللاهوائي لانتاج الغاز الحيوي و تم تدريب فنيي التشغيل على كيفية تشغيل معدة التكتيف و كميات البوليمر التي يجب اضافتها وايضا على طريقه تغذية الهاضم اللاهوائي بالتزامن مع ضخ الحمأة الاوليه المعالجه في وحده التكتيف الاولي (ليتم خلط المكونين معا وضخه الى الهاضم اللاهوائي) .

5.2 وحدة التكتيف الأولي (Primary Thickener)

يتم تكثيف الحمأة الأوليه المرسله من خزانات الترسيب الأوليه وبالتالي رفع نسبة المواد الصلبة من 2.5% إلى 6% وضخ الحمأة المكثفه الى الهاضم اللاهوائي علما ان هذه العمليه تتم بشكل تلقائي باستخدام نظام SCADA

5.3 وحدة استقبال المياه العادمة من معاصر الزيتون (Zebar Receiving Station)


حيث يتم استقبال مادة الزيبار من معاصر الزيتون خلال موسم قطف الزيتون حيث يتم معالجتها في الهاضم اللاهوائي لتقليل الاثر البيئي الضار الناتج عن التخلص من مادة الزيبار بطرق غير صحية ويتم من خلال المعالجة زيادة كمية الغاز الحيوي المنتجة.

5.4 الهاضم اللاهوائي (Anaerobic Digester)

بدأت عملية تغذية الهاضم اللاهوائي تدريجي باستخدام الحمأ الأوليه المترسبه في حوض الترسيب الاولي والحمأ المنشطة الزائده حيث يتم مراقبة العمليه الحيويه واللاهوائيه يوميا من خلال عمل القياسات لدرجة الحرارة ودرجة الحموضه ونسبة غاز ثاني اكسيد الكربو ناتج من التفاعل الحيوي داخل الهاضم اللاهوائي وايضا اضافة مادة الجبر الى محتويات الهاضم لأجل ضمان ثبات قيمة درجة الحموضة لتكون ما بين 6.8 7.2 فعليا انتاج الغاز الحيوي الذي يحتوي على نسبة 66% ميثان 33% ثاني أكسيد الكربون.

5.5 (Gas Holder)

يقوم الخزان بانتاج الغاز الحيوي من الهاضم اللاهوائي ويتم تعبئة خزان الغاز بعد مروره بفلتر الحصى لتنتيته من الشوائب و تم تدريب على اجراءات العمل في خزان الغاز و توضيح عمل مكثفات الغاز و شعلة الغاز و أجهزة القياس المختلفه للتحكم بكمية الغاز ويظهر لنا من الرسم التالي متوسط حجم الغاز المنتج لفترة عام كامل وكمية الانتاج والاستهلاك الشهرية.

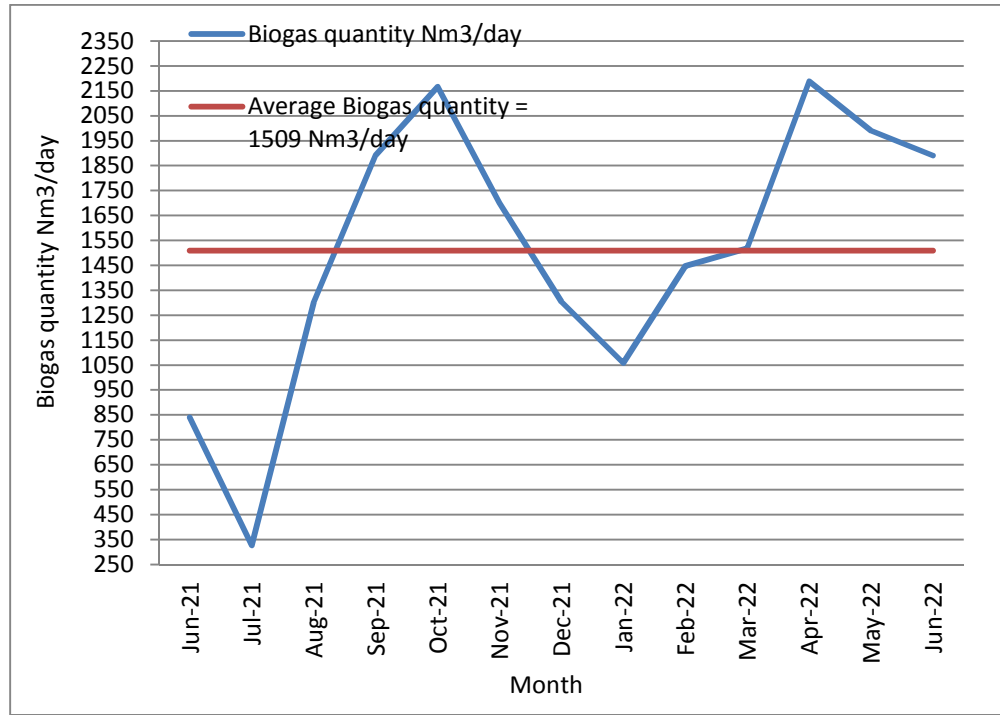


2022/6

2021/6

الكميات المنتجة من الغاز الحيوي يوميا

16: يوضح



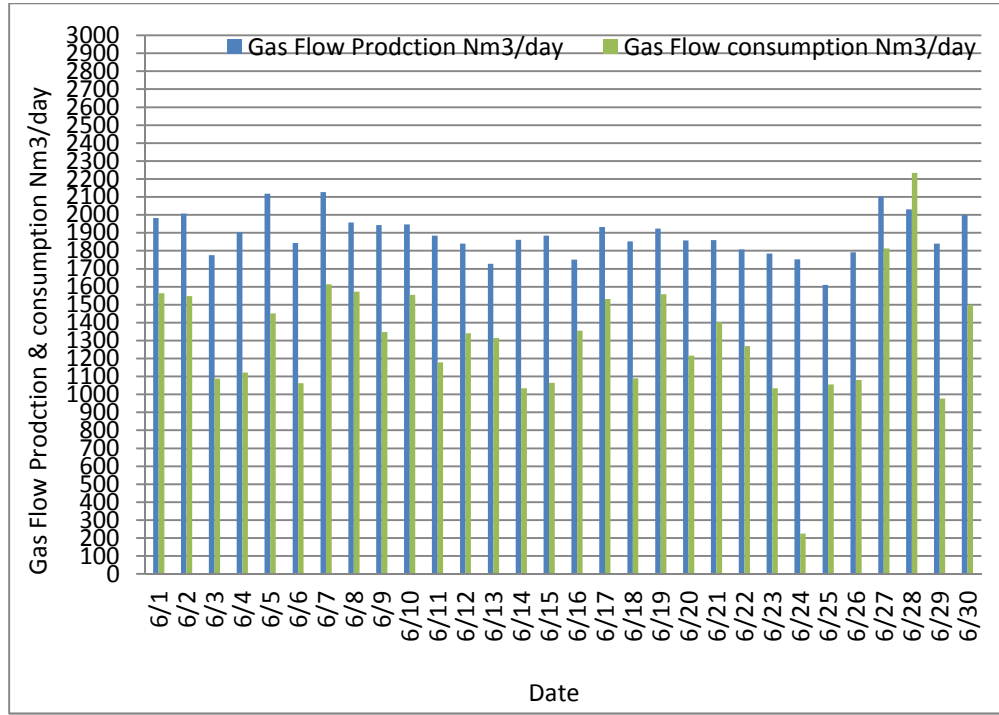

17: يوضح كمية الغاز الناتج والكمية المستهلكة
 درجة حرارة الهاضم اللاهوائي
 CHP لشهر 2022/6 والفرق بينهما والذي يتم استخدامه للبولر

5.6 شعله الغاز (Gas Flare)

عند امتلاء خزان الغاز الحيوي بنسبة 90% وذلك لتفريغ الغاز لدواعي السلامة العامة وتتوقف عند وصول النسبة الى 80% ويتم ذلك بواسطة نظام SCADA

5.7 احواض تجفيف الحمأة (Sludge Drying Beds)

يتم ضخ الحمأة المعالجة من خزان التكتيف الثانوي الى أحواض التجفيف وذلك 40-50%


5.8 تخزين الحمأة (Sludge Storing)

حيث يتم العمل على إدارة تخزين الحمأة وذلك بنقل الحمأة من أحواض التجفيف الى منطقة التخزين ويتم ذلك ويتم لاحقاً نقل الحمأة الى مكب بيئي معتمد من السلطات ذات العلاقة او الى الاراضي الزراعية ضمن تجربة عملية

(Liquor Storage Tank)

5.9


حيث تمت اعاده النظر في ضخ العصارة الى احواض التهوية بطريقه تضمن عدم تأثر العمليه البيولوجيه سلبيا .

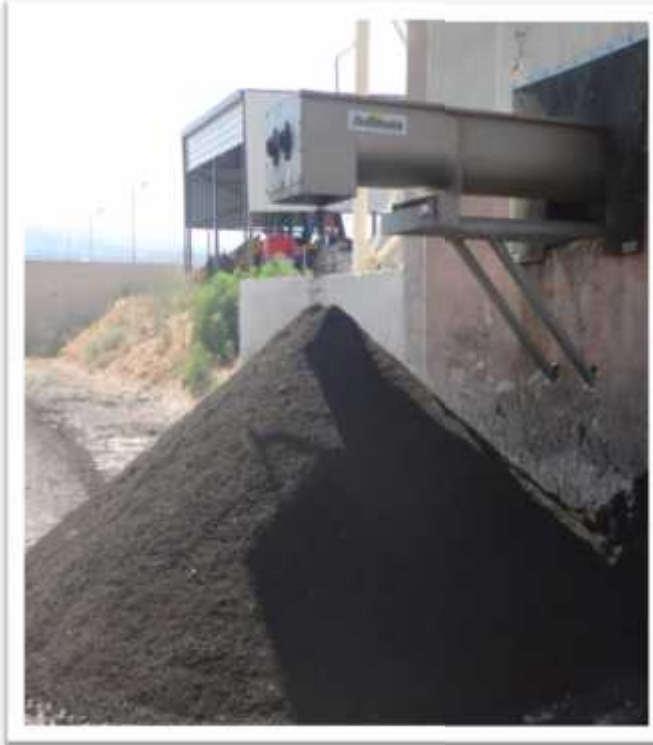


الحمأة الناتجة من وحدة عصر الحمأة




الهاضم اللاهوائي وشعلة الغاز

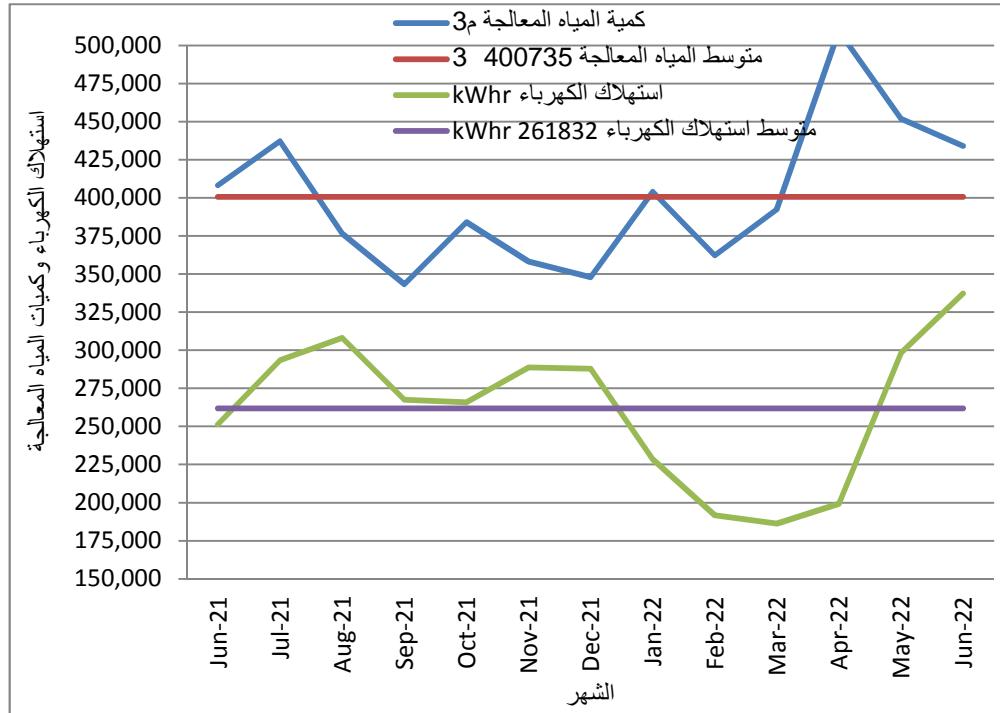

18: يوضح قيمة استهلاك الكهرباء وكمية المياه المعالجة 2022/6 2021/6

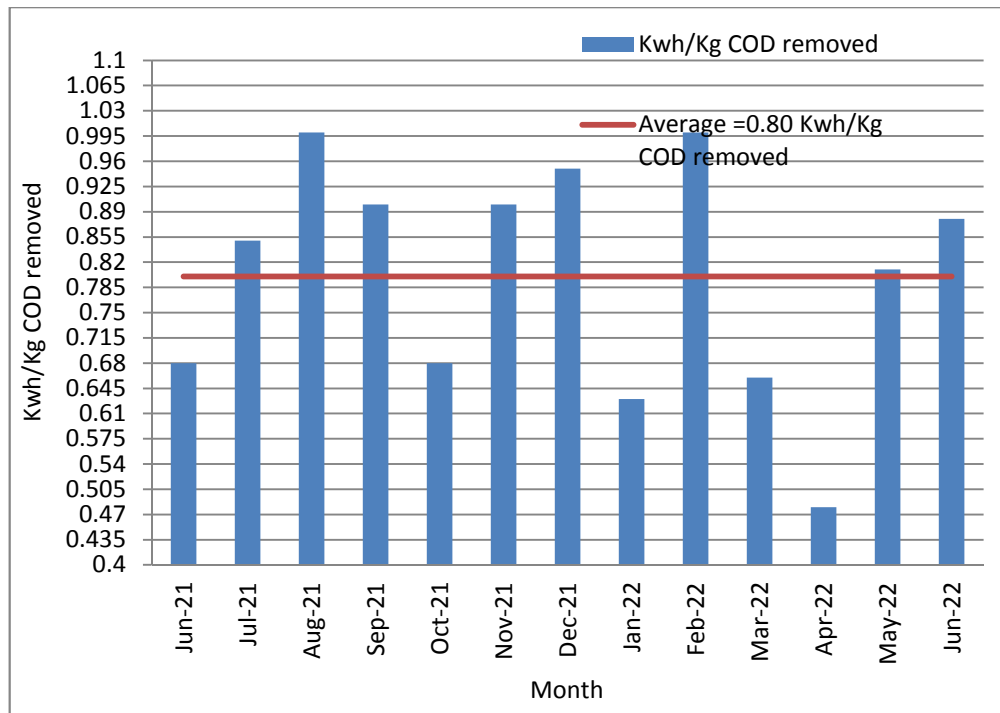

19: يوضح كميات الطاقة الكهربائية المستخدمة بدلالة كيلو واط ساعة لكل كغم COD 2022/6 2021/6

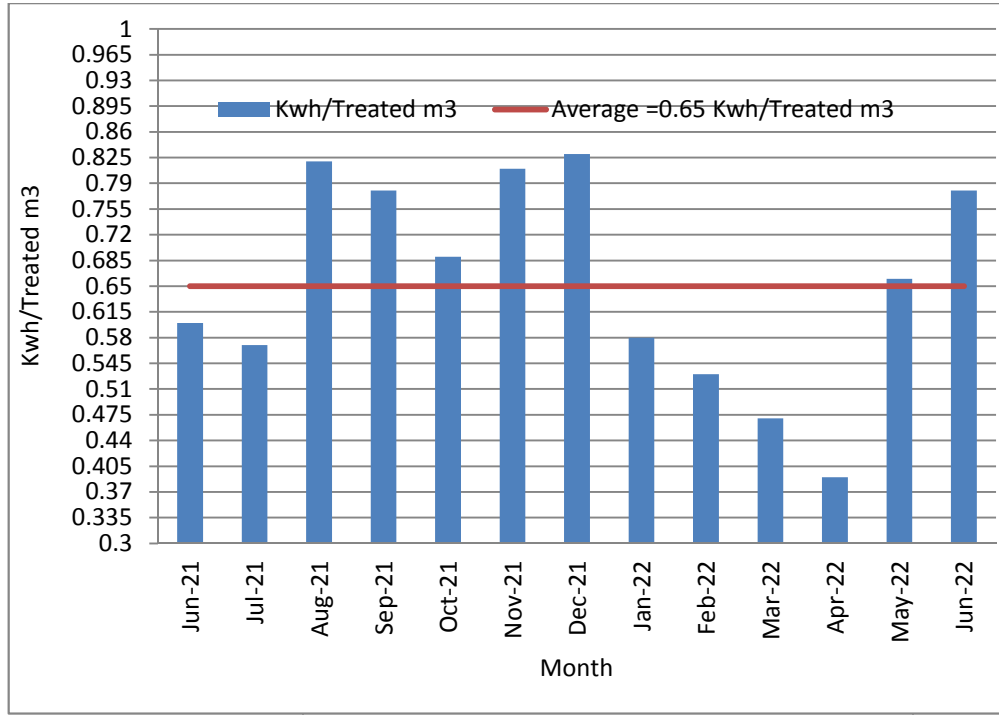

2022/6 2021/6 يوضح كميات الطاقة الكهربائية المستخدمة بدلالة كيلو واط ساعة لكل متر مكعب مياه معالجة

7 وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي (Desulfurization Unit)

تعتبر وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي احدى المكونات الرئيسية والأساسية لضمان سلامة واستمرارية وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية وذلك بمعالجة الغاز الحيوي المنتج من خلال ازالة غاز كبريتيد الهيدروجين (H_2S) ومادة السيلوكسين (Siloxane) يعتبر



وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي

8 وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية (CHP)

تعتبر وحدة توليد الطاقة الكهربائية من خلال حرق الغاز الحيوي احدى اهم استثمارات مخرجات محطة التنقية الغربية والتي تم تشغيلها بتاريخ 2017/6/18 حيث ستعمل على استغلال الغاز الحيوي المنتج وذلك بحرقه وتوليد طاقة كهربائية وحرارية ستصل حسب المتوقع مع ضمان استمرارية عملها ما يقارب 80% وقد تم خلال شهر ايار 73,819 كيلو واط بنسبة 22% من الاستهلاك الشهري.



وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية


9 الواح الطاقة الشمسية (Photo Voltaic panels)

تم بتاريخ 2018/5/1 تشغيل الالواح الشمسية 125 كيلو واط حيث تقوم هذه الالواح بالتقاط الطاقة الشمسية وتحويلها الى طاقة كهربائية يتم استخدامها في مضخات مشاريع اعادة الاستخدام للمياه المعالجة، مما يحقق توفير بحد اعلى 10% هـ ك الكهربائي للمحطة، وقد كان الانتاج لشهر ايار 26,814 كيلو واط أي ما نسبته 8%.

الموظفين المهرة وهم:

يعمل

المسمى الوظيفي		
مسؤول التشغيل	يوسف ابو جفال	1
مهندس المعالجة و	محمد حميدان	2
محاسب وسكرتير	سامح البيطار	3
فنية مختبر		4
مهندس زراعي لمشاريع	يزن عودة	5
فني تشغيل	عبد الهادي النوري	6
فني تشغيل		7
فني تشغيل		8
فني تشغيل	أمجد الشنتير	9
فني تشغيل	رامي حسيبا	10
فني كهرباء و اتمتة ()	عامر شنتير	11
فني ميكانيك و سائق الية		12
	براء فخر الدين	13
	اسماعيل شحادة	14
		15
		16
		17
	زياد أحمد	18
	زيدان أحمد	19

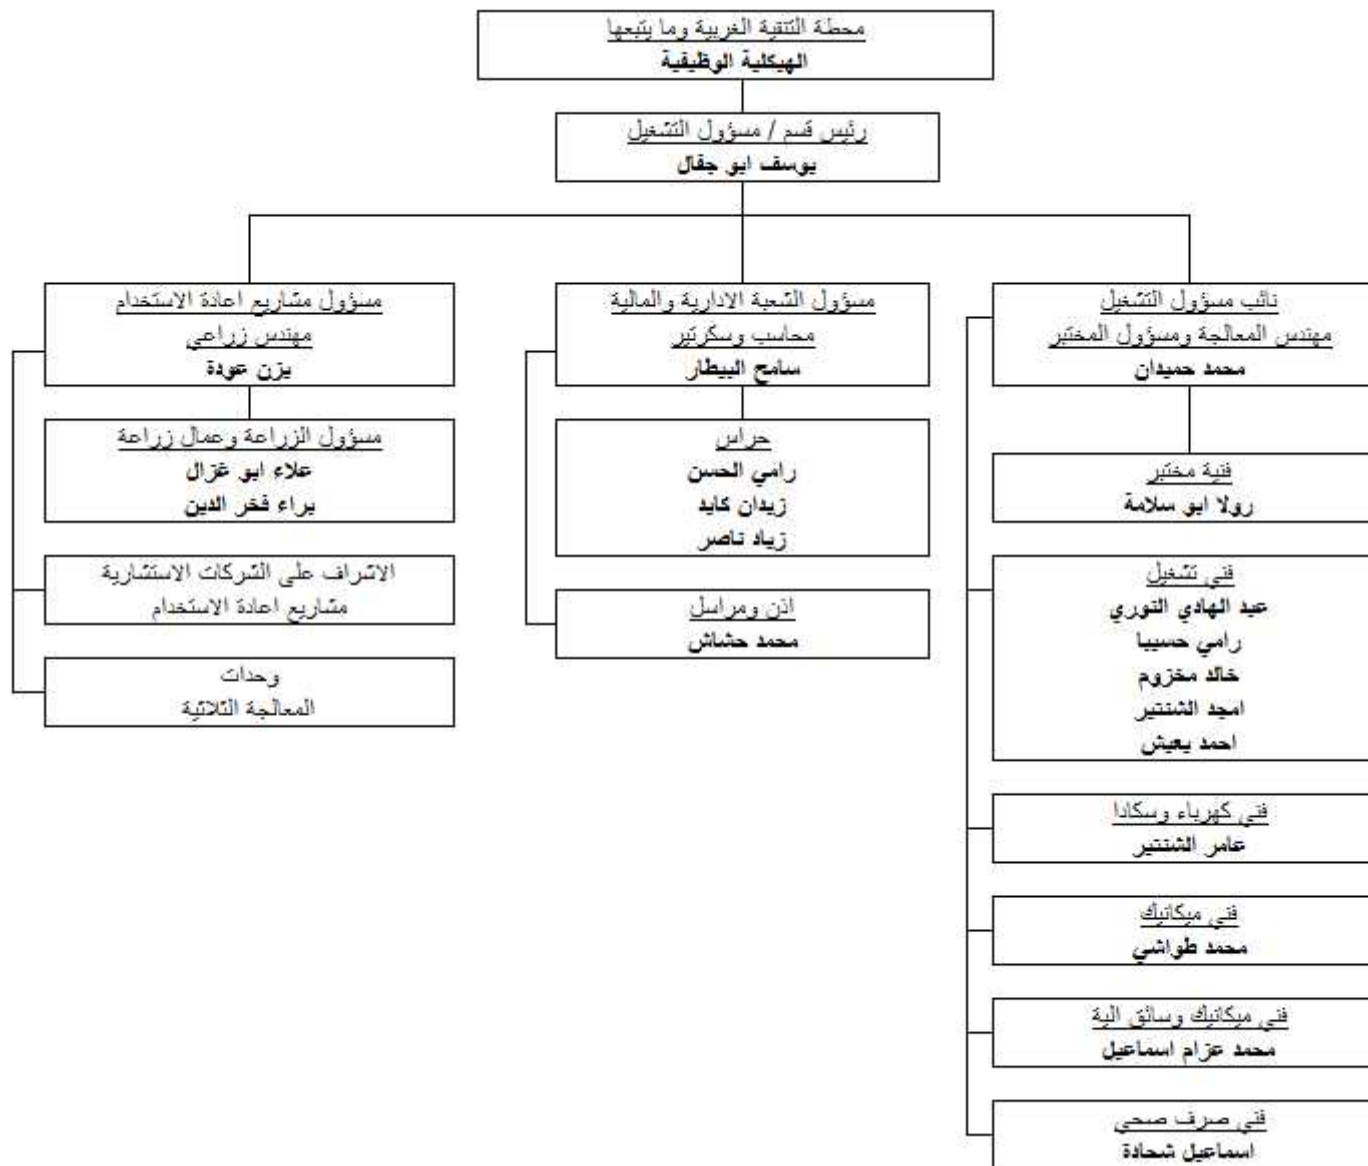

11 Summary

11.1 Results Summary

For period of 01/6/2022 to 30/6/2022, the results summary were as following:

Parameters	Design value 2020	Present value	Treatment %efficiency
Average incoming waste water m ³ /d	14000	14467	-----
Opening of Emergency gate to Wadi	-----	-----	-----
Inlet chemical oxygen demand COD _{in} mg/L	1100	925	-----
Outlet chemical oxygen demand COD _{out} mg/L	100	43	95%
Outlet biochemical oxygen demand BOD ₅ mg/L	20	9	98%
Inlet Biochemical oxygen demand BOD ₅ mg/L	550	462	-----
Sludge age (day)	13.7	15	-----
MLSS g/L	3	4.56	-----
TSS _{inlet} mg/L	500	311	-----
TSS _{outlet} mg/L	30	0	99.9%
Electrical consumption /m ³ kW/m ³	0.85	0.78	-----
Electrical consumption/kgCOD _{removed} kW/kg	0.8	0.88	-----
Avg. out NH4-N mg/l	-----	3.9	-----
Avg. inlet NH4-N mg/l	-----	47.5	-----
Avg. out PO4-P mg/l	-----	1.84	-----
Avg. in PO4-P mg/l	-----	20.5	-----
Avg. out NO3-N mg/l	-----	0.3	-----
Avg. in NO3-N mg/l	-----	-----	-----
Avg. out TN mg/l	-----	5	-----



11.2 استهلاك الكهرباء (Electrical Power Consumption)

الجدول التالي يبين الاستهلاك الشهري للكهرباء مع كميات المياه المعالجه 2021/6 مع ملاحظة انه قد تم تشغيل وحدة توليد الكهرباء الحرارية والحرارية بتاريخ 2017/6/18
وقد تم تشغيل الخلايا الشمسية بتاريخ 2018/5/1

الشهر	Avg	2021							2022					
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
كمية المياه المعالجه m ³	400,735	408,127	437,197	376,580	343,424	384,000	358,140	348,032	404,086	362,132	392,442	509,470	451,917	434,007
استهلاك كهرباء الشمال kWhr	261,832	226,440	275,861	247,035	161,233	147,551	164,762	219,093	196,580	141,700	133,743	111,296	206,550	236,649
استهلاك الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية kWhr		19,780	17,579	17,143	16,062	12,359	10,819	6,931	6,800	10,000	17,240	15,863	21,283	26,814
استهلاك الطاقة المنتجة من وحدة توليد الطاقة kWhr		5,230	0	43,818	90,145	105,855	113,094	61,906	25,000	40,000	35,200	72,171	70,412	73,819
كيلو واط / كوب	0.65	0.62	0.67	0.82	0.78	0.69	0.81	0.83	0.57	0.53	0.47	0.39	0.66	0.78



(Average Lab Results)

11.3

/ Test	Values	Average	2022						2021						
			Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan	Dec	Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun
COD out mg/l	Average	45.7	43.00	50.00	40.00	35.00	34.00	49.00	48.00	47.00	42.00	47.00	43.00	53.00	63.00
	Max	56.8	72.00	62.00	57.00	43.00	42.00	58.00	62.00	55.00	46.00	50.00	52.00	62.00	78.00
	Min	32.6	32.00	34.00	31.00	28.00	23.00	2.00	37.00	39.00	37.00	43.00	28.00	47.00	43.00
BOD out mg/l	Average	9.2	9.00	10.00	8.00	7.00	7.00	10.00	10.00	9.00	8.00	9.00	9.00	11.00	13.00
	Max	11.2	14.50	12.00	11.00	8.60	8.50	11.50	12.00	11.00	9.00	10.00	10.00	12.00	16.00
	Min	6.9	6.50	7.00	6.00	5.60	4.50	6.00	7.00	8.00	7.00	8.00	6.00	9.00	9.00
NH4-N out mg/l	Average	8.6	3.90	18.30	24.00	4.30	0.20	1.00	4.00	9.00	6.00	5.00	1.40	12.50	22.00
	Max	12.6	4.50	27.60	29.00	8.60	0.30	2.00	7.70	17.00	10.00	6.30	1.70	24.00	25.00
	Min	4.0	3.30	2.60	17.00	0.60	0.10	0.00	0.80	1.40	3.00	3.40	1.20	0.80	18.00
NO3-N out mg/l	Average	8.4	0.30	7.25	0.25	22.90	29.90	18.00	14.00	0.35	0.90	1.00	4.60	-	1.70
	Max	11.4	0.30	13.70	0.30	28.90	31.80	25.00	25.00	0.40	1.30	1.20	5.20	-	4.00
	Min	5.3	0.30	0.80	0.20	16.90	28.00	11.00	0.30	0.30	0.70	0.80	4.00	-	0.50
TN out mg/l	Average	17.0	5.00	17.00	24.00	19.00	31.00	21.00	15.40	16.00	9.60	10.00	8.00	-	28.00
	Max	19.1	5.00	17.00	28.00	19.00	31.00	27.00	20.80	20.00	13.00	10.00	9.00	-	29.00
	Min	14.8	5.00	17.00	20.00	19.00	31.00	15.00	10.00	12.00	5.00	10.00	7.00	-	27.00
PO4-P out mg/l	Average	3.8	1.84	2.62	5.82	4.96	4.00	2.92	2.84	4.72	4.15	3.74	3.20	3.75	4.82
	Max	3.9	1.84	2.62	5.82	4.96	4.00	2.92	2.84	4.72	4.15	3.74	4.00	3.75	4.82
	Min	3.7	1.84	2.62	5.82	4.96	4.00	2.92	2.84	4.72	4.15	3.74	2.40	3.75	4.82
TSS out mg/l	Average	7.8	0.00	7.00	3.00	1.00	0.00	2.00	9.00	13.00	16.00	10.00	16.00	13.00	12.00
	Max	15.7	4.00	12.00	12.00	6.00	0.00	6.00	16.00	22.00	34.00	14.00	40.00	16.00	22.00
	Min	2.9	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	8.00	3.00	6.00	4.00	10.00	2.00
MLSS mg/l	Average	4.3	4.56	3.52	3.54	3.53	4.16	5.60	6.44	5.80	4.23	3.74	4.00	3.17	3.40
	Max	5.2	5.61	4.27	4.23	4.62	4.88	6.60	8.60	6.60	5.91	4.25	4.80	3.80	3.90
	Min	3.4	3.25	2.92	2.85	2.63	3.50	4.70	5.60	4.50	2.76	3.35	3.20	2.46	2.90



12 الصيانة الوقائية والعلاجية (Preventive and remedial Maintenance)

صيانته الدورية لكافة وحدات محطة التنقية حيث تكون موزعه على فترات

صيانته دوريه يومي و أسبوعي و شهري و ذلك حسب كتيب المصنع و ذلك لضمان ديمومة عمل المعدات الميكانيكيه و الكهربائيه .
سبيل المثال قياس مستوى الزيت وإضافته الى صندوق التروس (Gearbox) (E-bearing) الخاصه بمزودات الهواء (Mammoth aerators) في خزانات التهوي و أيضا تفقد وحدات محطة ضخ الحمأة الاولية من ناحية قياس مستوى الزيت وايضا التشحيم ولكل الاجزاء الميكانيكية المتحركة على اساس دوري كجزء من برنامج الصيانة الوقائية ،
الحيوية للغاز الحيوي ووحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية ضمن برنامج الصيانة الوقائية ، علما ان الامور التاليه تم صيانتها خلال شهر حزيران 2022 :

ملخص تقرير القائم بالصيانة			
بعد الفحص تبين باهتراء اسياخ البولاد عدد 2 للقطاطات وقد تم استبدالها باسياخ جديدة من المخزون	230.1		خزان الترسيب
تم تركيب تحويلات ونبل وبربيش على المضخة واعادة تشغيلها حسب الاصول	222.1	تعطل مضخة نقل المياه من	
تم تركيب سده وعمل تحويلات وابقاف التسريب	222.2	تسريب مياه في محبس 2	
تم اضافة زيت بكمية 80	540	نقص في زيت تنك تعويض زيت	وتوليد الطاقة
تم القيام بالتشحيم المطلوب حسب الجدول واستخدام شحمة حرارية 220		التشحيم الدوري للوحدات	
تم غسل الخطوط وتركيب جلدة مجس واستخدام معجون اغلاق الفتحات لمنع تسريب الغاز		+ تسبيل + تسريب غاز	
تم القيام بالتشحيم المطلوب حسب الجدول واستخدام شحمة حرارية 220	460.1	التشحيم الدوري للوحدات	
